

# 2020 年大武口区一二三产业融合发展项目

## 绩效评价报告

项目单位：石嘴山市大武口区星海镇星光村、沟口街道、  
长胜街道兴民村、长兴街道龙泉村等 8 个单位

主管单位：石嘴山市大武口区人民政府

委托单位：石嘴山市大武口区财政局

评价机构：宁夏沪尚智评管理咨询有限公司

二〇二一年九月

# 目 录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	7
二、绩效评价工作开展情况.....	10
(一) 绩效评价目的、依据、对象和范围.....	10
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评分标准.....	12
(三) 绩效评价工作过程.....	14
三、综合评价情况及评价结论.....	15
四、绩效评价指标分析.....	16
(一) 项目决策情况.....	16
(二) 项目管理情况.....	20
(三) 项目产出情况.....	23
(四) 项目效益情况.....	26
五、存在的问题.....	30
六、有关建议.....	32
附件一：资金复核表.....	35
附件二：项目复核表.....	40
附件三：指标体系评分表.....	60
附件四：项目负责人访谈提纲.....	66
附件五：意见签收单.....	68

# 2020 年大武口区一二三产业融合发展项目

## 绩效评价报告

根据《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《关于印发〈大武口区全面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》（石大党发〔2019〕32号）要求，本公司受大武口区财政局委托，对2020年大武口区一二三产业融合发展项目进行绩效评价。我公司制定绩效评价方案并成立评价组，通过财务和项目资料收集、问卷和访谈调研、汇总分析数据等一系列必要的评价程序后，形成本评价报告。

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 项目背景

大武口区为贯彻党的十九大，推进大武口区经济社会高质量发展，按照《自治区人民政府办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的实施意见》（宁政办发〔2016〕131号）、《自治区党委 人民政府关于推进脱贫致富战略的实施意见》（宁党办发〔2017〕33号）及《自治区财政厅关于加强农村一二三产业融合发展资金管理使用的通知》（宁财政〔农〕发〔2019〕342号）等相关文件要求开展大武口区一二三产业融合发展项目，项目紧紧围绕优质粮食和草畜、蔬菜、枸杞、葡萄“1+4”特色优势产业，兼顾地方特色产业，因地制宜落实扶持政策。扶持对象为各类农业新型经营主体、村集体经济组织、农业产业化龙头企业及农业社会化服务组织等；扶持范围为农村一二三产业

融合发展的薄弱环节包括生产、加工、销售服务等环节短板；扶持方式可以直接补助以奖代补、先建后补，也可采取贷款贴息、政府购买服务等。由大武口区财政局将农村一二三产业融合发展项目资金拨付大武口区沟口街道、长胜街道龙泉村、长兴街道兴民村、星海镇星光村、枣香村、星海村、果园村、富民村（股份经济合作社），资金由大武口区财政局进行监管。2020年大武口区一二三产业融合发展项目对硒有田园综合体二期建设项目等8个项目进行了补助。

## 2. 资金投入和使用情况

根据《关于2020年农村综合技改暨一二三产业融合发展资金分配计划的通知》（石大财发〔2020〕38号），2020年大武口区一二三产业融合发展项目预算资金1205万元，实际到位1205万元。截至2021年8月31日，项目实际执行1099.67万元，预算执行率为91.26%。（资金复核情况见附件一）。项目到位资金及支出明细见下表所示：

2020年大武口区一二三产业融合发展项目到位及支出明细表

单位：元

序号	单位名称	项目名称	到位金额	支出金额	预算执行率
1	大武口区沟口街道办事处	硒有田园综合体二期建设项目	3000000	2536447	84.55%
2	星海镇星光村	食用醋厂加工配套项目	1200000	1200000	100.00%
3	星海镇枣香村	现代温棚基础设施建设项目	1500000	1046772.9	69.78%
4	星海镇星海村	有机肥加工跑马场温棚观光服务业项目	500000	500000	100.00%
5	星海镇果园村	民俗园垂钓采摘项目	350000	347070	99.16%
6	星海镇富民村	设施日光温室项目	500000	500000	100.00%
7	长胜街道潮湖村、龙泉村、长胜村	潮湖村瑞宝葫芦非遗研学农村一二三产业融合发展基地一期、龙泉村特色名宿附属工程等、长胜村光伏养牛场	3000000	2999999.99	100.00%

8	长兴街道兴民村	兴民村畜禽粪污资源化利用项目、八大庄一二三产业融合发展示范工程、兴民村农产品加工销售仓储物流园建设项目	2000000	1866432.61	93.32%
合计			12050000	10996722.5	91.26%

### 3. 项目主要内容及实施情况

2020年大武口区一二三产业融合发展项目共涉及8个项目单位8个子项目。截至绩效评价日，7个子项目按计划及时完成，1个子项目未完工（项目复核情况见附件二）。各子项目完成情况见下表所示：

2020 年大武口区一二三产业融合发展项目主要内容及实施情况

序号	单位名称	项目名称	主要内容	实施情况
1	大武口区沟口街道办事处	砾有田园综合体二期建设项目	翠柳社区导视牌 1 座、转盘铁艺雕塑 1 座、沟口集市标识牌 1 座、停车场 2500 m <sup>2</sup> 、人行道铺装 100 m <sup>2</sup> 、面包砖铺装 2000 m <sup>2</sup> 、汞道牙铺装 560m、仿真竹帽 20 个、木栅栏花池 186m，磨坊屋面维修 100 m <sup>2</sup> 、蔬菜区沿线道路提升 2000m 等	项目完成
		特色种植产业发展扶持	补助大拱棚 1.1 亩、中拱棚 31.3 亩、一桌菜 6 个单位、一朵花 1 个单位、一件礼 2 个单位、一个景 2 个单位	奖补完成
2	星海镇星光村	食用醋厂加工配套项目	新建单层办公室、化验室以及原料库，建筑面积 208.38 平方米；新建单层发酵车间，建筑面积 69.04 平方米等	项目完成
			新建门房公厕 1 座；室外硬化、给排水、供暖管网、围墙等配套工程	项目完成
			酿醋原料谷物、小麦 37000 斤（1.6 元/斤）；玉米 27540 斤（1.3 元/斤）	项目完成
			反渗透净水机 1 台、风淋门 1 台	项目完成
3	星海镇枣香村	现代温棚基础设施建设项目	新建 8 栋新型温棚，占地面积约 9120 平方米，拱棚 2 栋，2400 m <sup>2</sup> /栋，日光棚 6 栋 720 m <sup>2</sup> /栋、温棚智能设备采购及安装、智能物联监控项目	温棚建设工程已完成，智能物联监控尚未完成
4	星海镇星海村	跑马场项目	跑马场（面积 300 多亩）场地平整、种树。草料场（面积 300 多亩）场地平整、挖排水沟、灌渠等	项目完成
		移动舞台演出	演出 14 天	项目完成
5	星海镇果园村	民俗园垂钓采摘项目	文化园室内装修 10 室 580 m <sup>2</sup>	项目完成
		渔湖开挖	渔湖开挖、进出水口制作、围栏 650 米、制作警示牌 10 块、增氧机 3 台	项目完成
6	星海镇富民村	设施日光温室项目	新建 6 栋新型温棚，占地面积约 4800 m <sup>2</sup> ，其中日光棚 6 栋，每棚种植面积 960 m <sup>2</sup>	项目完成
7	长胜街道潮湖村、龙泉村、长胜村	龙泉村乡村旅游特色民宿-附属工程项目	维修破损路面 3500 平方米，铺设水泥砖 11000 平方米，安装围栏 2500 米，新建广场 1000 平方米；维修改造水塘，建设水系 4000 平方米；绿化荒山，绿化面积 200 亩；建设景观亭 3 个	项目完成

		龙泉村美丽家园建设项目	维修破损路面 3500 平方米，铺设水泥砖 11000 平方米，安装围栏 2500 米，新建广场 1000 平方米；维修改造水塘，建设水系 4000 平方米；绿化荒山，绿化面积 200 亩；建设景观亭 3 个	项目完成
8	长兴街道兴民村	八大庄路口路广林庭院征收	1.土地补偿费 1.3416 亩*35578 元/亩=47731.44 元; 2.其他建筑物: 房屋 3 间 66.24 平米, 饲料房 2 间 25.48 平米, 羊圈棚 2 间 86.99 平米, 小计补偿费 137681.58 。 二、土地补偿费 0.41 亩*35578 元/亩=14586.98 元。	项目完成
		兴民村农产品加工销售仓储物流园建设项目	加工销售仓储物流园，建筑面积为 1128.50 平方米，新建农产品加工车间为地上一层坡屋顶建筑，道路硬化 300 平方米	项目完成

#### 4. 项目的组织及管理

##### (1) 项目组织情况

大武口区人民政府：项目主管部门，负责项目统筹管理，相关工作的监督和指导，管理各项工作的检查和考核。

大武口区财政局：负责项目资金批复。全过程跟踪协调监管责任，除了对项目入库、资金申报审核把关外，还指导督促项目实施单位在依法依规的前提下加快资金使用进度，同时规范会计账务处理，清晰、准确的反映一二三产业融合发展资金使用情况。

沟口街道等 8 个单位：项目实施单位，将项目任务分解到位，制定实施方案、规划安排、审核上报数据，监督指导项目运作，控制资金运行，组织检查验收等。

##### (2) 项目管理情况

①项目申报：各预算单位根据辖区农业现代化建设要求及自治区人民政府关于推进一二三产业融合发展的文件精神，进行项目实施方案编制。

②项目批复：2020 年一二三产业融合发展资金共计支持 3 个政府投资项目，5 个壮大村集体经济项目。政府投资项目由项目实施单位对拟实施的一二三产业融合发展项目向区发改局提出立项申请，由区发改局对项目的可行性及项目概算进行批复。壮大村集体经济项目由大武口区委组织部对项目实施方案进行批复。

③政府采购及公示：国家规定的限额标准以下的建设项目，划分二个限额标准实施。对依法公开招标的建设项目，执行《宁夏回族自



治区招标投标管理》规定，依法在“中国招标投标公共服务平台”或者“宁夏公共资源交易网”发布招标公告和公示信息。

④项目管理：政府投资项目实行项目法人责任制、工程监理制、合同管理制度、招投标制。政府投资项目应当按照投资主管部门或者其他有关部门批准的建设地点、建设规模和建设内容实施。预算单位根据管理要求，开展项目质量、进度监督管理。

⑤项目验收：项目竣工及各专项验收完成后且档案资料齐全，由项目主管部门向区发改局提出书面申请，由区发改局组织住建、财政、环保等部门进行项目验收。

## 5. 利益相关方

主管单位	大武口区人民政府
项目实施单位	沟口街道等 8 个单位
服务单位	宁夏融源建筑工程有限公司 87 家单位、个人
项目受益方	大武口区沟口街道等 8 个单位辖区范围内居民、企业

### （二）项目绩效目标

#### 1. 总目标

通过一二三产业融合发展项目，进一步壮大大武口区农业特色优势产业，大力发展设施农业与休闲观光农业相结合的城郊型现代设施农业，推进与农产品深加工、文化旅游产业融合发展，创建 3 个自治区星级休闲农业企业和 1 个国家级一二三产业融合发展示范园，推进硒有田园市场化运营，发挥“富硒”产业品牌优势，丰富乡村经济业态，拓展农民增收空间。

## 2. 年度目标

开展硒有田园综合体二期工程，带动富硒大米、富硒瓜菜等产业发展；奖补特色种植产业，调动广大农民和经营主体积极投入大棚种植、引进新品种、产品深加工等产业；通过龙泉村乡村旅游特色民宿附属工程和龙泉村美丽家园建设工程，吸引社会投资，带动辖区居民就业，增加村民收入；完成食用醋厂配套工程，使食用醋厂建设初期能够维持运营；开展星海村跑马场项目、果园村民俗园垂钓采摘项目，通过将农产品生产、加工、销售环节与旅游业结合等方式，获得一定经济收益，壮大村集体经济；完成枣香村8栋现代温棚建设、富民村6栋温棚建设、兴民村1座标准化厂房及停车场建设，通过转租获取租金的形式壮大村集体经济，促进农业增效、农民增收、农村繁荣。具体绩效目标如下：

项目年度绩效目标表

目标类型	目标名称		目标值
产出数量	硒有田园综合体二期建设项目	硒有田园	建设硒有田园1个。包括：翠柳社区导视牌1座、转盘铁艺雕塑1座、沟口集市标识牌1座、停车场2500m <sup>2</sup> 等
	特色种植产业发展扶持项目	奖补特色种植产业	奖补大拱棚1.1亩、中拱棚31.3亩、一桌菜6个单位、一朵花1个单位、一件礼2个单位、一个景2个单位
	食用醋厂加工配套项目	食用醋厂门房及公厕	门房1座、公厕1座
	枣香村现代温棚基础设施建设项目	新型温棚	拱棚2栋、日光棚6栋
	跑马场项目	跑马场	300多亩场地平整
	移动舞台演出	移动舞台演出	演出14天
	民俗园垂钓采摘项目	文化园室内装修	10室580m <sup>2</sup>
	渔湖开挖项目	渔湖	开挖渔湖1个

目标类型	目标名称		目标值
	富民村设施日光温室项目	日光棚	6 栋
	龙泉村乡村旅游特色民宿-附属工程项目	龙泉村乡村旅游特色民宿-附属工程	硬化砼道砖铺装 500 平方米, 砼硬化 50 平方米, 花岗岩铺装 300 平方米停车场, 透水砖铺装 600 平方米等
	龙泉村美丽家园建设项目	龙泉村美丽家园广场景观节点改造提升工程	维修破损路面 3500 平方米, 铺设水泥砖 11000 平方米, 安装围栏 2500 米, 新建广场 1000 平方米; 维修改造水塘, 建设水系 4000 平方米; 绿化荒山, 绿化面积 200 亩; 建设景观亭 3 个
	兴民村农产品加工销售仓储物流园建设项目	新建标准化厂房	1 个
		道路硬化	300 m <sup>2</sup>
产出质量	验收合格率		100%
产出时效	工程完工及时性		100%
经济效益	食用醋厂加工配套项目	收入增加	建设初期维持运营
	枣香村现代温棚基础设施建设项目	收入逐年增加	转租 8 栋温棚获取租金, 第一年 6000 元/栋, 计 4.8 万元; 第二年 7000 元/栋, 计 5.6 万元; 第三年 8000 元/栋, 计 6.4 万元。拱棚 2 栋租赁标准, 第一年 2.16 万/栋, 计 4.32 万; 第二年 2.5 万元/栋, 计 5 万元; 第三年 2.9 万元/栋, 计 5.8 万元。
	跑马场项目	收入增加	建设初期维持运营
	民俗园垂钓采摘项目	收入增加	建设初期维持运营
	富民村设施日光温室项目	收入逐年增加	转租 6 栋日光温室获取租金, 第一年 7000 元/栋, 计 4.2 万元; 第二年和第三年 8000 元/栋, 计 4.8 万元; 第四年至承包期在 8000 元基础上递增 5%, 8400 元/栋, 计 5.04 万元, 承包期 5 年
	兴民村农产品加工销售仓储物流园建设项目	获取稳定收入	转租获取租金, 停车场 5 万元/年, 厂房 7 万元/年
社会效益	硒有田园综合体二期建设项目	带动相关产业发展	带动富硒大米、富硒瓜菜等产业发展
	特色种植产业发展扶持项目	鼓励发展创意农业	调动广大农民、经营主体积极投入大棚种植、引进新品种、产品深加工等产业项目, 促进农业发展和农民增收
	龙泉村乡村旅游特色民宿-附属工程项目、龙泉村美丽	带动辖区居民就业	社会投资增多, 带动辖区居民就业, 增加村民收入

目标类型	目标名称	目标值
	家园建设项目	
生态效益	美化人居环境	基础设施更加完善，园区环境面貌得到改善
满意度	受益群众满意度	≥90%

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、依据、对象和范围

#### 1. 评价目的

（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状的深入调研和分析，了解 2020 年大武口区一二三产业融合发展项目的实施情况，为全面、客观、公正对项目作出绩效评价提供依据。

（2）通过评价，发现项目资金使用、项目建设管理、项目执行过程中存在的问题并提出合理化建议，以提升政府资金的使用效益，了解项目中的预算编制中存在的问题，以促进项目预算单位提升本项目预算编制管理水平。

（3）通过评价，分析 2020 年大武口区一二三产业融合发展项目的产出和效果情况，及整体绩效情况，对现行的相关管理制度和机制的健全、规范情况进行调查和论证，并为完善以后年度组织、实施、管理项目提供参考。

#### 2. 评价依据

##### （1）财务管理制度

① 《中华人民共和国预算法》；

②《自治区财政厅关于加强农村一二三产业融合发展资金管理使用的通知》（宁财政（农）发〔2019〕342号）；

③《关于2020年农村综合技改暨一二三产业融合发展资金分配计划的通知》（石大财发〔2020〕38号）。

## （2）项目管理

①《政府投资条例》（国务院令 第712号）；

②《宁夏回族自治区政府投资项目管理和责任追究办法》（宁政发〔2014〕99号）；

③《宁夏回族自治区招标投标管理办法》（自治区人民政府令 第103号）；

④《自治区人民政府办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的实施意见》（宁政办发〔2016〕131号）；

⑤《自治区党委 人民政府关于推进脱贫攻坚战略的实施意见》（宁党办发〔2017〕33号）；

⑥批复、验收、公示及其他与项目相关的资料。

## （3）绩效评价管理

①《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

②关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167号）；

③《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

④《关于印发〈大武口区全面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》（石大党发〔2019〕32号）。

（4）其他作为评价依据的材料

- ①财政预算批复文件；
- ②项目验收材料等文件；
- ③相关项目公示、档案资料等；
- ④相关财务报表、帐簿、凭证。

### 3. 绩效评价对象和范围

（1）评价对象

本次绩效评价对象为2020年大武口区一二三产业融合发展项目。

（2）评价范围

时间范围	2020年1月1日-2020年12月31日
资金范围	一二三产业融合发展资金1205万元
实施地点	大武口区

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评分标准

#### 1. 绩效评价指标确定原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2. 评价指标体系及标准

指标体系包括评价指标表和基础表两部分，评价指标表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。评价指标体系分别从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个方面对其财政支出进行评价，权重分别为 15%、24%、24%和 37%。指标权重设计遵循了以结果为导向原则，并适度关注过程管理。本次绩效评价的指标设计按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号要求，在宁夏回族自治区财政支出绩效评价指标框架的基础上对二、三级指标进行细分，并根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。权重设置严格按照财预〔2020〕10号文要求，产出、效益指标权重大于等于 60%，决策、管理指标权重小于等于 40%，三级指标权重按照目标矩阵优先级排序法确定。

评价标准主要是参照计划标准制定。对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。

## 3. 评价方法

本次绩效评价主要采用以下评价方法：

(1) 比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

#### 4. 评分标准

绩效评价结果初步采用评分和评级相结合的方式，评价结果分优、良、中和差 4 个考评等级。总分设置为 100 分，依据制定的考评指标打分后：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

### （三）绩效评价工作过程

评价组在完成前期调研工作后，编制了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、原则、指标体系、标准、社会调查方案等。项目组严格按照工作方案，经过了数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，完成了绩效评价报告工作。

#### 1. 基础数据采集

由项目单位进行基础数据填报工作，并经绩效评价小组核对汇总。

##### （1）财务数据

财务数据是指财政预算资金，以及项目实际支出，评价人员通过核查预算部门财务部提供的项目批复文件、相关合同、资金支出情况、相关费用付款清单和相关凭证；并且根据预算部门填写的基础数据表逐项进行核实；核查财务报表和其他数据统计资料。采用查看会计账



册等方法调查项目资金使用是否符合资金管理办法、是否符合支付规定、是否出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象。

## **(2) 业务数据**

项目实施情况、验收情况等资料从项目基础数据表中进行统计，并根据相关资料对数据核实。

## **2. 问卷调查**

调查对象为 2020 年大武口区一二三产业融合发展项目受益居民。调查对象数量根据项目实际完成情况确定，计划选取大武口区沟口街道办事处晒有田园、星海镇星光村食用醋厂、星海镇枣香村、星海镇星海村跑马场、星海镇果园村民俗园、星海镇富民村、长胜街道潮湖村、龙泉村、长胜村、长兴街道兴民村农产品加工销售仓储物流园的受益居民 80 人进行问卷调查。调查完成后，由绩效评价小组工作人员即时回收并根据问卷调查数据分析，对社会满意度进行打分，并据此撰写了满意度调查报告。

## **3. 访谈调研**

根据工作方案，绩效评价小组对项目单位进行了访谈，针对项目的资金使用情况、项目管理情况、工作取得的成绩与效益以及工作中存在的问题和改进建议等问题进行了详细了解。

## **4. 数据分析及撰写报告**

评价小组以绩效目标为标杆，以评分标准为依据，对采集的数据进行处理、分析，对指标进行评分，提炼结论撰写报告。

## **三、综合评价情况及评价结论**

一级指标评分汇总表

项目	项目决策	项目管理	项目产出	项目效益	合计
权重	15.00	24.00	24.00	37.00	100
得分	10.50	21.14	22.00	26.79	80.43
得分率	70.00%	88.08%	91.67%	72.41%	80.43%

经评价，项目总得分为 80.43 分，属于“良”。

2020 年大武口区一二三产业融合发展项目完成 7 个子项目建设，项目建设完成率 87.50%。项目开展硒有田园综合体二期工程，带动富硒大米、富硒瓜菜等产业发展；奖补特色种植产业，调动广大农民和经营主体积极投入大棚种植、引进新品种、产品深加工等产业；通过龙泉村乡村旅游特色民宿附属工程和龙泉村美丽家园建设工程，吸引社会投资，带动辖区居民就业，增加村民收入。但项目效益指标设置未能细化、量化、可衡量、可考核。星海镇星光村食用醋厂加工配套项目改变资金使用范围，未履行项目调整手续。星海镇星光村、枣香村、星海村、果园村、富民村未能做到专账专户管理，财务管理不规范，部分项目合同管理不规范。项目长效管理机制基本健全但有待完善。星海镇星海村跑马场项目、星海镇果园村民俗园垂钓采摘项目、兴民村农产品加工销售仓储物流园建设项经济效益不佳。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

项目决策指标评分表

指标	权重	得分
立项依据充分性	2.00	2.00
立项程序规范性	3.00	2.00

绩效目标合理性	3.00	3.00
绩效指标明确性	3.00	1.00
预算编制科学性	2.00	1.50
资金分配合理性	2.00	1.00
合计	15.00	9.75

### 立项依据充分性

2020年大武口区一二三产业融合发展项目符合《自治区党委 人民政府关于推进脱贫富民战略的实施意见》（宁党办发〔2017〕33号）目标要求，符合《自治区人民政府办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的实施意见》（宁政办发〔2016〕131号）“紧紧围绕优质粮食和草甸、蔬菜、枸杞、葡萄1+4特色优势产业”和“兼顾地方特色产业”的项目实施范围。该指标满分2.00分，根据评分标准得2.00分。

### 立项程序规范性

2020年一二三产业融合发展资金共计支持3个政府投资项目，5个壮大村集体经济项目。政府投资项目由项目实施单位对拟实施的一二三产业融合发展项目向区发改局提出立项申请，由区发改局对项目的可行性及项目概算进行批复。壮大村集体经济项目由大武口区委组织部对项目实施方案进行批复（项目批复文件见附件二）。政府投资项目实施单位未按照《宁夏回族自治区政府投资项目管理和责任追究办法》（宁政发〔2014〕99号）要求进行依法公开。该指标满分3.00分，根据评分标准得2.00分。

### 绩效目标合理性

2020 年大武口区一二三产业融合发展项目设置了开展晒有田园建设、奖补特色种植产业、食用醋厂门房及公厕建设、新型温棚建设、开展移动舞台演出、文化园室内装修工程、渔湖开挖、龙泉村乡村旅游特色民宿附属工程、龙泉村美丽家园广场景观节点改造提升工程、新建标准化厂房、道路硬化等目标，绩效目标与实际工作内容相符且与预算确定的资金计划相匹配。该指标满分 3.00 分，根据评分标准得 3.00 分。



### **绩效指标明确性**

各预算单位均设置了年度总体目标和绩效目标，并根据绩效目标设定了清晰、细化、可衡量的数量指标及标杆值，但对于项目经济效益、社会效益、可持续影响指标不明确，未设置项目效益指标标杆值。部分预算单位未填制绩效目标申报表。该指标满分 3.00 分，根据评分标准得 1.00 分。

### **预算编制科学性**

3 个政府投资项目实施单位均按照《关于 2020 年农村综合技改暨一二三产业融合发展资金分配计划的通知》（石大财发〔2020〕38 号）要求，明确资金使用范围和项目建设内容，工程建设类项目通过委托第三方设计单位编制了可行性研究报告、项目概算或实施方案，编制依据为工程量及定额，并上报大武口区发改局审批。2 个壮大村集体经济项目实施单位未能提供项目预算编制标准及清单，且部分单位资金额度与年度目标不相符。该指标满分 2.00 分，根据评分标准得 1.50 分。

## 资金分配合理性

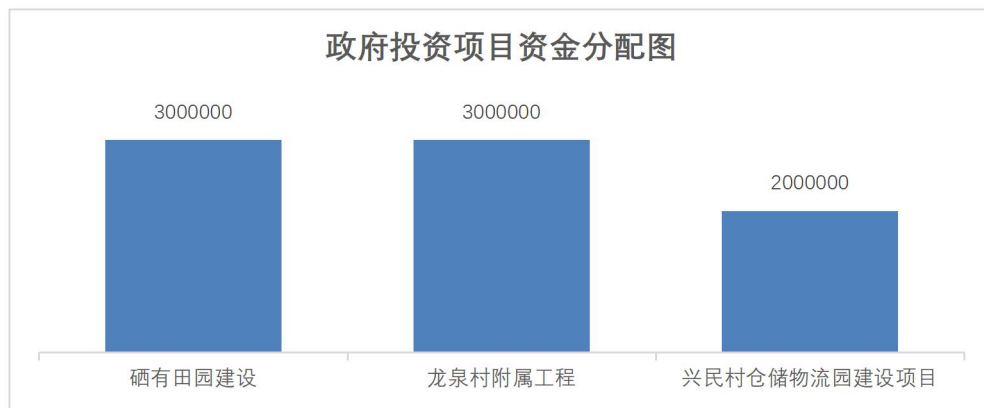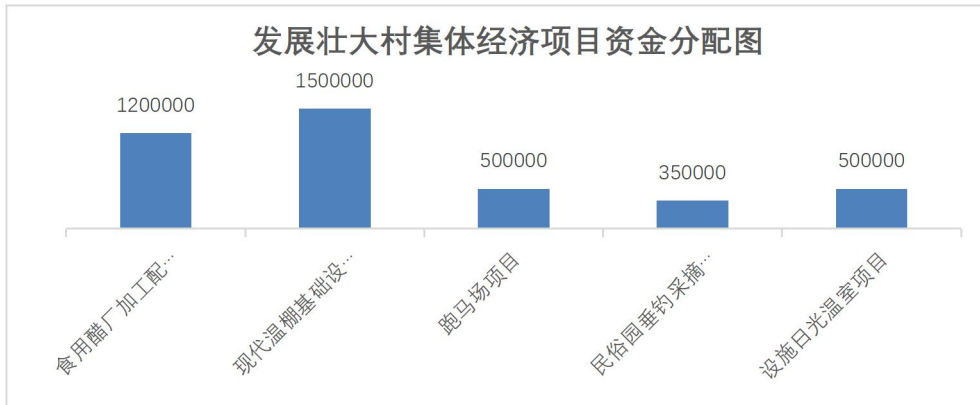

大武口区财政局在各预算单位申报征集项目的基础上，依据一二三产业融合发展资金使用流程、使用范围和重点支持环节，拟定了2020年一二三产业融合发展资金项目，于2020年6月23日下达资金计划文件。晒有田园特色种植产业依据《大武口晒有田园特色种植产业发展扶持政策》（石大政发〔2020〕6号）“大拱棚6000元/亩，中拱棚4000元/亩”标准进行扶持。民宿产业依据《大武口区民宿产业发展扶持政策的通知》（石大政发〔2020〕7号）“‘一桌菜’奖补1500元、‘一件礼’奖补1000-5000元、‘一朵花’奖补1000元、‘一个景’奖补2000元”标准进行扶持。但是，未建立各类休闲文

化旅游产业的扶持标准。项目资金分配情况如上图所示。该指标满分 2.00 分，根据评分标准得 1.00 分。

## （二）项目管理情况


项目管理指标评分表

指标	权重	得分
资金到位率	3.00	3.00
预算执行率	4.00	3.64
资金使用合规性	4.00	3.50
财务管理规范性	3.00	2.50
组织机构	1.00	1.00
政府采购管理	2.00	2.00
合同管理	3.00	1.50
验收管理	3.00	3.00
档案管理	1.00	1.00
合计	24.00	21.14

### 资金到位率

2020 年一二三产业融合发展资金 1205 万元于 2020 年 6 月 23 日下达各单位，资金到位率 100%。该指标满分 3.00 分，根据评分标准得 3.00 分。

### 预算执行率

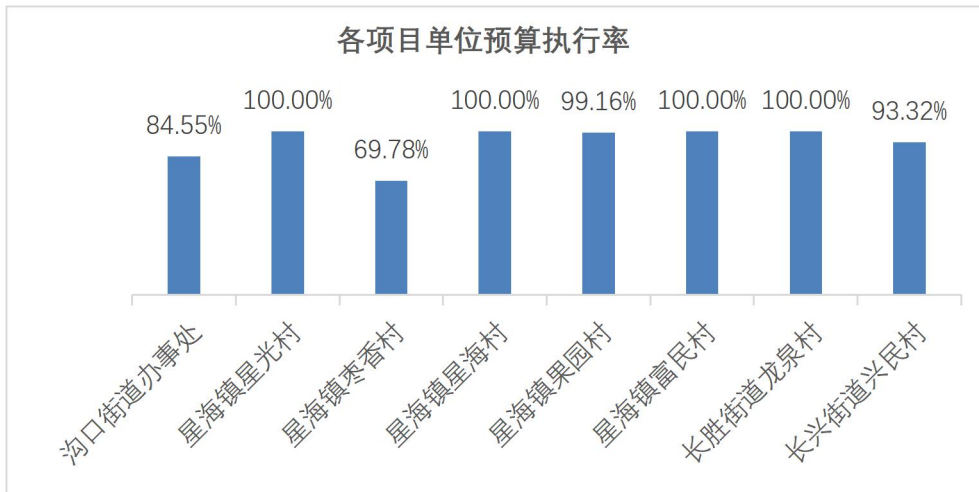

审核各预算单位提供的支出凭证等相关资料,2020年大武口区一二三产业融合发展项目预算资金1205万元,实际到位1205万元。截至2021年8月31日,项目实际执行1099.67万元,预算执行率为91.26%(资金复核情况见附件一)。各预算单位预算执行情况见上图所示。该指标满分4.00分,根据评分标准得3.64分。

### 资金使用合规性

通过对项目财政资金使用情况抽查,星海镇星光村一二三产业融合发展资金120万计划用于食用醋厂加工配套项目,包括市内外场地硬化绿化、室外给排水、消防、采暖、供电管网、围墙以及生产设备等购置。但是,星海镇星光村40万元用于主体工程建设,9.5万元用于购买小麦和玉米等生产原料,星海镇星光村股份经济合作社未向上级部门申报,未履行项目调整手续。资金使用范围不符合《关于2020年农村综合技改暨一二三产业融合发展资金分配计划的通知》(石大财发〔2020〕38号)要求。该指标满分4.00分,得3.50分。

### 财务管理规范性

通过对项目财务管理情况进行核查，项目承担单位的资金管理、费用支出等制度健全。但是，星海镇星海村支付王红 14 万元移动舞台费及车费、支付王晓青 19200 元收割青锄玉米机耕费、支付薛云露 10200 元玉米草包打捆费等未能提供合同，票务手续不齐全。星海镇星光村、枣香村、星海村、果园村、富民村未能做到专账专户管理。该指标满分 3.00 分，得 2.50 分。

### **组织机构**

大武口区财政局负责一二三产业融合发展资金分配，全过程跟踪协调监管责任，除了对项目申报、资金分配把关外，还指导督促项目实施单位在依法依规的前提下加快资金使用进度，同时规范会计账务处理，清晰、准确的反映一二三产业融合发展资金使用情况。各预算单位负责组织项目实施，确保资金使用安全合规，并按规定核算资金使用情况。项目组织机构健全，分工明确。该指标满分 1.00 分，根据评分标准得 1.00 分。

### **政府采购管理**

通过对项目招投标资料的查阅，单项或批量采购预算金额超过限额的货物和服务类政府采购项目，均按照工程建设管理规定采用公开招标的方式进行，公开透明，公示程序及招投标程序合规、完整，委托的第三方机构具有相关资质（复核情况见附件二）。该指标满分 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

### **合同管理**



4 个单位 4 个子项目合同管理规范，各项目单位与第三方服务机构签订了服务项目协议，具体规定了服务内容、服务标准、责任义务，以及费用支付方式等要素，并且能够按照合同条款严格执行。但是，4 个单位 4 个子项目合同管理有待规范，星海镇枣香村、长胜街道龙泉村、长兴街道兴民村未与受托单位约定完成期限或未填写签订日期，星海镇星海村部分支付款项未能提供合同。项目复核情况见附件二。该指标满分 3.00 分，根据评分标准得 1.50 分。

### 验收管理

通过对项目验收报告的查阅，工程建设类项目由建设单位、监理单位、设计单位和施工单位联合验收，政府采购类项目由各项目单位自行验收，项目验收管理程序完整，工程竣工验收单、政府采购项目验收报告等资料齐全。该指标满分 3.00 分，根据评分标准得 3.00 分。

### 档案管理

根据各项目提供的资料，项目制定了相应的档案管理制度，且项目资料齐全，包括各类合同、招投标文件、验收鉴定单等。该指标满分 1.00 分，根据评分标准得 1.00 分。

## （三）项目产出情况

项目产出指标评分表

	指标	权重	得分
产出数量	晒有田园综合体二期建设项目田园综合体	2.00	2.00
	特色种植产业发展扶持项目奖补特色种植产业	1.00	1.00
	食用醋厂加工配套项目门房及公厕数量	1.00	1.00
	枣香村现代温棚基础设施建设项目新型温棚数量	1.00	0.50
	跑马场项目跑马场平整面积	1.00	1.00

	移动舞台演出	1.00	1.00
	民俗园垂钓采摘项目文化园室内装修面积	1.00	1.00
	渔湖开挖项目渔湖个数	1.00	1.00
	富民村设施日光温室项目日光棚个数	1.00	1.00
	龙泉村乡村旅游特色民宿-附属工程项目	2.00	2.00
	龙泉村美丽家园建设项目	2.00	2.00
	兴民村农产品加工销售仓储物流园建设项目新建 标准化厂房及道路硬化	1.00	1.00
		1.00	1.00
产出 质量	验收合格率	4.00	3.00
产出 时效	工程完工及时性	4.00	3.50
	合计	24.00	22.00

### 项目完成数量

根据工程竣工验收单等资料,2020年大武口区一二三产业融合发展项目共涉及8个项目单位8个子项目。截至绩效评价日,7个子项目按计划及时完成,1个子项目未完工(项目复核情况见附件二),项目完成率87.50%。

政府投资项目完成:①晒有田园综合体二期建设项目完成翠柳社区导视牌1座、转盘铁艺雕塑1座、沟口集市标识牌1座、停车场2500m<sup>2</sup>、人行道铺装100m<sup>2</sup>、面包砖铺装2000m<sup>2</sup>、汞道牙铺装560m、仿真竹帽20个、木栅栏花池186m,磨坊屋面维修100m<sup>2</sup>、蔬菜区沿线道路提升2000m等。特色种植产业发展扶持项目共计补助大拱棚1.1亩、中拱棚31.3亩、一桌菜6个单位、一朵花1个单位、一件礼2个单位、一个景2个单位。

②龙泉村乡村旅游特色民宿-附属工程项目硬化砼道砖铺装 500 平方米，砼硬化 50 平方米，花岗岩铺装 300 平方米停车场，透水砖铺装 600 平方米等；龙泉村美丽家园建设项目维修破损路面 3500 平方米，铺设水泥砖 11000 平方米，安装围栏 2500 米，新建广场 1000 平方米；维修改造水塘，建设水系 4000 平方米；绿化荒山，绿化面积 200 亩；建设景观亭 3 个。

③八大庄路口路广林庭院征收项目支付土地补偿费 1.3416 亩 \*35578 元/亩=47731.44 元，其他建筑物房屋 3 间 66.24 平米，饲料房 2 间 25.48 平米，羊圈棚 2 间 86.99 平米，小计补偿费 137681.58，完成支付土地补偿费 0.41 亩\*35578 元/亩=14586.98 元；兴民村农产品加工销售仓储物流园建设项目完成 1128.50 平方米仓储物流园建设，完成道路硬化 300 平方米。

发展壮大村集体经济项目完成：①食用醋厂加工配套项目新建门房 1 座，公厕 1 座。②富民村完成 6 栋新型温棚建设。③星海村跑马场（面积 300 多亩）场地平整、种树。④果园村文化园室内装修 10 室 580 m<sup>2</sup>。

星海镇枣香村温棚智能设备采购及安装项目于 2020 年 10 月 29 日签订合同，约定 2020 年 10 月 29 日-2021 年 1 月 15 日完工，截至 2021 年 8 月 31 日尚未完工。该指标满分 16.00 分，根据评分标准得 15.50 分。

### 项目完成质量

根据工程竣工验收单、政府采购项目验收报告等资料，工程建设类项目由建设单位、监理单位、设计单位和施工单位联合验收，政府采购类项目由各项目单位自行验收。2020年大武口区一二三产业融合发展项目共计8个子项目，应验收合格项目数量8个，实际星海镇枣香村温棚智能设备采购及安装项目因未完工而未进行验收，星海镇星海村支付王红14万元移动舞台费及车费无合同和验收单。项目验收合格率75%。（复核情况见附件二）。该指标满分4.00分，根据评分标准得3.00分。

#### 项目完工及时性

根据工程质量竣工验收记录和各方项目验收报告等资料，2020年大武口区一二三产业融合发展项目应及时完工工程数量8个，实际7个项目及时完工，星海镇枣香村温棚智能设备采购及安装项目尚在实施中且完成期限超过合同约定时间（复核情况见附件二）。该指标满分4.00分，根据评分标准得3.50分。

#### （四）项目效益情况

项目效益指标评分表

	指标	权重	得分
经济效益	食用醋厂加工配套项目收入增加	3.00	1.00
	枣香村现代温棚基础设施建设项目收入逐年增加	3.00	3.00
	跑马场项目收入增加	2.00	0.00
	民俗园垂钓采摘项目收入增加	2.00	0.00
	富民村设施日光温室项目收入逐年增加	2.00	2.00
	兴民村农产品加工销售仓储物流园建设项目获取稳定收入	3.00	1.00
社会效益	晒有田园综合体二期建设项目带动相关产业发展	4.00	4.00

	特色种植产业发展扶持项目鼓励发展创意农业	3.00	3.00
	龙泉村乡村旅游特色民宿-附属工程项目、龙泉村美丽家园建设项目带动辖区居民就业	4.00	4.00
可持续影响 (3分)	长效管理机制健全有效	5.00	3.00
满意度	受益群众满意度	6.00	5.79
	合计	37.00	26.79

## 经济效益

部分项目缺乏科学合理的长效规划，基层组织队伍缺乏管理经验，导致项目发展后劲不足，效益不佳。

星海镇星光村食用醋厂加工配套项目主体工程招标价 161 万元，配套工程招标价 138 万元，星光村星源醋厂自 2020 年 10 月份开始投产，截止 2021 年 8 月 31 日，共计销售食用醋 12867 斤，销售金额 47681 元。项目尚处于前期打开销路阶段，所获取收入无法维持日常运营。

星海镇星海村跑马场项目于 2019 年 10 月投入运营，星海村股份合作社 2020 年马场收入 15023.02 元，受多种因素影响，项目目前处于停运状态。由于 2019 年项目建设初期总投资额过大，建设后期资金短缺，基础设施不健全且 2020 年疫情发生后各村封路，人流量大幅减少，经营收入甚微。

星海镇果园村民俗园垂钓采摘项目于 2020 年 10 月开始运营，截止 2021 年 8 月 31 日，获取收入 6 万多，受 2020 年疫情影响，人流量大幅减少，且股份经济合作社相关负责人员缺乏民俗园管理和运营经验，项目经济效益甚微，所获取收入无法维持日常运营。

兴民村农产品加工销售仓储物流园建设项目通过转租获取租金，停车场 5 万元/年。但是，因标准化厂房未通过消防验收，尚无法产生经济效益。

星海镇枣香村通过转租 8 栋温棚获取租金，第一年 6000 元/栋，计 4.8 万元；第二年 7000 元/栋，计 5.6 万元；第三年 8000 元/栋，计 6.4 万元。拱棚 2 栋租赁标准，第一年 2.16 万/栋，计 4.32 万；第二年 2.5 万元/栋，计 5 万元；第三年 2.9 万元/栋，计 5.8 万元。符合项目目标收益。

星海镇富民村转租 6 栋日光温室，第一年 7000 元/栋，计 4.2 万元；第二年和第三年 8000 元/栋，计 4.8 万元；第四年至承包期在 8000 元基础上递增 5%，8400 元/栋，计 5.04 万元，承包期 5 年。符合项目目标收益。该指标满分 15.00 分，根据评分标准得 7.00 分。

### **社会效益**

砾有田园综合体二期项目建成后农业和旅游基础大幅提升，辖区环境面貌明显改善，一二三产业融合发展更加紧密，社会各种投资力度明显增大，就业创业活力进一步增强，带动富硒大米、富硒瓜菜等产业进一步发展。龙泉村附属工程项目和美丽家园项目建设完成后，龙泉村成功创建国家 3A 级旅游景区，年接待游客 60 万次，实现营业收入 620 万元，带动 500 余人次实现家门口就业，村民人均收入由 1.4 万元增至 1.9 万元。兴民村农产品加工销售仓储物流园建设项目带动华泰农业科技有限公司标准化供港蔬菜示范种植基地及八大庄生态科技有限公司，搭建起完整产业链条，实现企业从生产环节向加工、

销售、仓储等二三产业融合发展，扩展业务范围，实现农业经营效益提升。但因部分项目下半年竣工投产，投入生产时间短，项目因资金缺口较大无法形成一定规模，对生产力有影响，因此目前经济效益还未完全发挥。该指标满分 11.00 分，根据评分标准得 11.00 分。

### **可持续影响**

根据相关管理人员访谈提纲等资料，预算单位针对各项目建立了项目管理机制，在工程前期、施工过程及缺陷责任期内由各项目单位主导。一二三产业融合发展资金使用范围和管理依据自治区财政厅《自治区财政厅关于加强农村一二三产业融合发展资金管理使用的通知》（宁财政（农）发〔2019〕342号），项目管理依据《大武口区人民政府关于印发大武口区政府投资项目管理办法的通知》（石大政规〔2021〕1号），一二三产业融合发展项目管理制度基本健全。星海镇星海村跑马场项目、星光村食用醋厂加工配套项目、果园村民俗园垂钓采摘项目等未建立长效管理制度，缺乏项目审批、招投标和验收管理办法，项目经济效益不佳。长兴街道兴民村农产品加工销售仓储物流园项目建设前期未考虑标准化厂房消防建设要求，致使项目建成后无法完成消防验收。该指标满分 5.00 分，根据评分标准得 3.00 分。

### **受益群众满意度**

对 2020 年大武口区一二三产业融合发展项目涉及的 8 个子项目的受益居民进行问卷调查，走访大武口区沟口街道办事处、星海镇星光村、枣香村、星海村、果园村、富民村、长胜街道龙泉村、长兴街

道兴民村的受益居民 80 人进行问卷调查。发放调查问卷 80 份，实际回收有效问卷 80 份，问卷回收率 100%。项目总体满意度为 88.61%，部分村民对项目经济效益实现情况的满意度较低。该指标满分 6.00 分，根据评分标准得 5.79 分。

## 五、存在的问题

### 1. 部分项目经济效益不佳

星海镇星光村食用醋厂加工配套项目主体工程招标价 161 万元，配套工程招标价 138 万元，星光村星源醋厂自 2020 年 10 月份开始投产，截止 2021 年 8 月 31 日，共计销售食用醋 12867 斤，销售金额 47681 元。项目尚处于前期打开销路阶段，所获取收入无法维持日常运营。星海镇星海村跑马场项目于 2019 年 10 月投入运营，星海村股份合作社 2020 年马场收入 15023.02 元，受多种因素影响，项目目前处于停运状态。由于 2019 年项目建设初期总投资额过大，建设后期资金短缺，基础设施不健全且 2020 年疫情发生后各村封路，人流量大幅减少，经营收入甚微。星海镇果园村民俗园垂钓采摘项目于 2020 年 10 月开始运营，截止 2021 年 8 月 31 日，获取收入 6 万多，受 2020 年疫情影响，人流量大幅减少，且股份经济合作社相关负责人员缺乏民俗园管理和运营经验，项目经济效益甚微，所获取收入无法维持日常运营。兴民村农产品加工销售仓储物流园建设项目通过转租获取租金，停车场 5 万元/年。但是，因标准化厂房未通过消防验收，尚未产生经济效益。部分项目缺乏科学合理的长效规划，基层组织队伍缺乏管理经验，导致项目发展后劲不足，效益不佳。



## 2. 项目预算绩效管理理念有待加强

各预算单位均设置了年度总体目标和绩效目标，并根据绩效目标设定了清晰、细化、可衡量的数量指标及标杆值，但对于项目社会效益、可持续影响指标未设置项目效益指标标杆值。5个预算单位未填制绩效目标申报表。在一定程度上影响项目目标对项目实施的约束作用，而且不利于后期对项目实施做出全面的评价。

## 3. 部分项目调整程序有待规范

星海镇星光村一二三产业融合发展资金120万计划用于食用醋厂加工配套项目，包括市内外场地硬化绿化、室外给排水、消防、采暖、供电管网、围墙以及生产设备等购置。但是，星海镇星光村40万元用于主体工程建设，9.5万元用于购买小麦和玉米等生产原料，星海镇星光村股份经济合作社未向上级部门申报，未履行项目调整手续。资金使用范围不符合《关于2020年农村综合技改暨一二三产业融合发展资金分配计划的通知》（石大财发〔2020〕38号）要求。

## 4. 部分项目管理不规范

政府投资项目实施单位未按照《宁夏回族自治区政府投资项目管理和责任追究办法》（宁政发〔2014〕99号）要求进行依法公开。2个壮大村集体经济项目实施单位未能提供项目预算编制标准及清单，且部分单位资金额度与年度目标不相符。星海镇星海村跑马场项目、星光村食用醋厂加工配套项目、果园村民俗园垂钓采摘项目等未建立长效管理制度，缺乏项目审批、招投标和验收管理办法，项目经济效益不佳。星海镇星海村支付王红14万元移动舞台费及车费、支付王

晓青 19200 元收割青锄玉米机耕费、支付薛云露 10200 元玉米草包打捆费等未能提供合同，财务凭证手续不齐全。星海镇枣香村、长胜街道龙泉村、长兴街道兴民村未与受托单位约定完成期限或未填写合同签订日期。星海镇星光村、枣香村、星海村、果园村、富民村未能做到专账专户管理。

## **六、有关建议**

### **1. 完善项目长效管理机制和人才培养机制**

坚持民主决策，在选择集体经济发展项目和确定经营方式上，必须让群众广泛讨论，集思广益，科学论证，充分搞好发展村集体经济项目的可行性研究，以增加造血功能和可持续发展为出发点，选准项目，选好项目，借船出海，借鸡生蛋，努力规避市场风险和经营风险。建立项目长效管理机制，根据项目不同发展阶段科学制定项目长期规划。培育发展壮大村集体经济“领路人”，强力优化村领导班子，持续发挥农村基层党组织基层堡垒作用，建设基层农业管理服务队伍。大力选育引领村集体经济发展的带头人队伍，如职业经理人、种粮大户、农民专业合作社和农机合作社负责人，鼓励吸引大学生回乡创业，建立健全激励与监督机制，调动队伍工作积极性，重点打造有文化、懂技术、会经营、善开拓的一流村集体经济发展专业队伍。

### **2. 科学合理设置绩效目标表**

建议各预算单位加强对项目目标的管理，在制定部门年度工作目标时，应根据工作计划填报绩效目标申报表，明确项目完成的目标和

目标值，并应制定相应的约束手段，从而提高目标管理对完成项目的约束力，体现目标管理的有效性。

### **3. 规范项目管理**

进一步完善村级财务、收益分配和村务公开等制度，对现金管理、开支审批、固定资产管理、专项资金的使用等重大事项，必须通过村合作社理事会研究决定，严格审核把关，确保资金资产的正常运行。严格按照《宁夏回族自治区政府投资项目管理和责任追究办法》（宁政发〔2014〕99号）要求进行依法公开。建立项目长效管理制度，规范项目审批、招投标和验收管理办法。明确项目预算编制标准及清单，强化监督管理，明确乡镇对村级财务的监管职责，建立健全相关内控制度，确保发展壮大村集体经济资金核算规范，信息真实、完整、准确。严格财务监管责任追究，对发现的违规违法问题，加大处理处罚力度，依法依规严肃追责问责，确保发展壮大村集体经济资金发挥效益，助力乡村振兴。

### **4. 加强项目管理**

建议各项目单位加强项目实施过程中的日常工作督查和流程管理，细化各相关单位的工作职责，以便对项目实施过程进行整体把控，在签订合同后加强项目进度管理，督促服务方按照合同要求及时开工准时完工。项目建设完成后及时开展验收工作，严格按照《自治区人民政府关于印发〈宁夏回族自治区政府投资项目管理和责任追究办法〉的通知》（宁政发〔2014〕99号）、《2020年2020年宁夏回族

自治区本级政府采购目录及标准》（宁政办发〔2020〕3号）要求，进行项目竣工验收和政府采购项目验收。

## 附件一：资金复核表

### 2020年大武口区一二三产业融合发展资金复核表

序号	单位名称	项目名称	到位资金（元）	受托单位	支付金额（元）	费用类别
1	大武口区沟口街道办事处	晒有田园综合体二期建设项目	3000000	宁夏融源建筑工程有限公司	2247675	工程款
				宁夏鹏程飞建设工程咨询有限公司	15774	造价咨询
				杭州火石品牌策划有限公司	80000	策划费
				福建瑞晟建筑工程造价咨询有限公司宁夏分公司	10198	控制价审核款
				宁夏大地测绘科技有限公司	15000	测绘费
		石嘴山市大武口区孙家苑家庭农场		29600	特色种植扶持资金	
		大武口区青青乐园农家乐		19500	特色种植扶持资金	
		王建梅（新晒望特色种植扶持资金）		16000	特色种植扶持资金	
		黄继潭（紫川蔬菜园）		71200	特色种植扶持资金	
		石嘴山市大武口区吴家大院农家乐		7900	大棚扶持资金 6400	
		刘增明（枣恋农庄）		6000	特色种植扶持资金	
		大武口区沟口园中苑农家乐		1500	特色种植扶持资金	
		王秀梅（梅杏桃园）		10100	特色种植扶持资金	
		马雪原（绿森森特色种植）		4500	特色种植扶持资金	
黄英杰（云翔家园）	1500	特色种植扶持资金				
2	星海镇星光村	食用醋厂加工配套项目	1200000	宁夏旭源建设工程有限公司	400000	工程款
				宁夏瑞拓建设工程有限公司	500000	工程款
				宁夏朗石规划建筑设计院有限公司（记账名称错误）	20000	设计费
				苏金虎	105031	安装费
				大武口区尚农天润果蔬种植合作社	59200	杂粮款
				大武口区尚农天润果蔬种植合作社	35802	杂粮款
				宁夏澜淼商贸有限公司	53695	反渗透净水机及风淋门费
				宁夏商文化传媒有限公司	26272	包装设计费

序号	单位名称	项目名称	到位资金（元）	受托单位	支付金额（元）	费用类别
3	星海镇枣香村	现代温棚基础设施建设项目	1500000	宁夏环筑建设有限公司	843854.5	工程款
				浙江公和建筑工程设计有限公司宁夏分公司	25000	设计费
				银川正恒工程管理有限公司	22386	监理费
				石嘴山市凯西测绘工程有限公司	3000	测绘费
				宁夏智博科技有限公司	118042.4	技术服务费
				宁夏智博科技有限公司	12370	技术服务费
				朱建龙	9500	广告制作安装费
				邵东厚	4620	五金建材费
				刘福生	8000	温棚底座维修
4	星海镇星海村	有机肥加工跑马场温棚观光服务业项目	500000	贾金平	12400	50 铲车机械施工费
				陈军	720	挖机机械施工费
				李永杜	23070	50 装载机机械施工费
				谢东林	20660	挖沟机机械施工费
				蒙勤花	1280	挖沟机机械施工费
					1440	挖沟机机械施工费
				杨小红	1640	挖沟机机械施工费
				杨剑	8700	30 装载机机械施工费
				魏斌	1200	农运汽车机械施工费
				魏鹏	18800	农运汽车机械施工费
				张海军	2400	挖机机械施工费
				李鱼子	2800	汽车机械施工费用
				柳强	2720	农用汽车机械施工费
				李永聪	3040	汽车机械施工费用
				杜金红	1830	拖拉机机械施工费
				张骥	3900	30 装载机机械施工费
				党严举	9750	挖沟机机械施工费
吴三锁	5330	挖沟机机械施工费				
柳浩	14400	挖沟机机械施工费				

序号	单位名称	项目名称	到位资金 (元)	受托单位	支付金额 (元)	费用类别
				宁夏博达劳务有限公司 (岳喜便)	100000	工程款
				王红	140000	
				张银山	1738.98	
				星海村	4960	十一马场搞活动购买电线费
				合作社马场人员	26250	职工薪酬
				马学虎	12688	马场拉草费
				董小龙	4000	文艺演出赔偿金
					1530	马场场地碾压施工费
				王晓青	19200	收割青锄玉米机耕费
					3300	购买办公桌椅贷款
				张银山	1850	
					4500	沙发、茶几
					9760	马场十一交流会临时工工资
					6600	玉米地灌水费
				马学虎	6123	马场拉草
					1320.07	购买炉子、烟筒、铲子
				薛云露	10200	玉米草包打捆费
				李俊祥	7532	人员工资
郭家权	2367.95	马场劳务费				
5	星海镇果园村	民俗园垂钓采摘项目	350000	宁夏吉润建设工程有限公司	205420	工程款
				张满库	10570	工程款
				魏鹏军	11500	压路机租赁费、砂石转运费
				平罗县诚德瑞工程机械租赁部	59200	机械租赁费
				宁夏众象广告传媒有限公司	1650	制作费
				银川市金国厨酒店用品批发部	58730	购买厨具
6	星海镇富民村	设施日光温室项目	500000	银川市第一建筑工程有限公司	500000	工程款
7	长胜街道	潮湖村瑞宝葫芦非	3000000	邓彦田	1738.67	劳务费

序号	单位名称	项目名称	到位资金（元）	受托单位	支付金额（元）	费用类别
	潮湖村、龙泉村、长胜村	遗研学农村一二三产业融合发展基地一期、龙泉村特色名宿附属工程等、长胜村光伏养牛场			12000	劳务费
					12000	劳务费
				宁夏正乙实业有限公司	1524664.8	工程款
				宁夏旭升建筑工程有限公司	993977.74	工程款
				微微新娘婚纱店	1000	服装造型费
				大武口区摄影家协会	16187.5	服务费
				宁夏嘉盛建设有限公司	10289.64	工程款
				银川长城工程监理有限公司	19638	监理费
				宁夏众合泰建筑工程有限公司	90961.44	工程款
				宁夏中建天宏工程咨询有限公司	17514	编制费
				宁夏众业工程造价咨询有限公司	14794	编制费
				宁夏鸿建建设监理有限公司	8262	监理费
				宁夏鸿建建设监理有限公司	29594	监理费
				宁夏鸿建建设监理有限公司	50148	监理费
				宁夏正彦建设项目管理有限公司	20082	造价咨询
				四川振鸿工程项目管理有限公司宁夏分公司	68065.9	设计费
					18058.3	测量费
				宁夏中建天宏工程咨询有限公司	12405	编制费
				宁夏鸿建建设监理有限公司	35892	监理费
				山东正方建设项目管理有限公司银川分公司	7983	造价咨询
宁夏正彦建设项目管理有限公司	34744	造价咨询				
8	长兴街道 兴民村	兴民村畜禽粪污资源化利用项目、八大庄一二三产业融合发展示范工程、兴民村农产品加工销售仓储物流园建设项目	2000000	路金宝	14586.98	土地补偿金
				陆金良	185413.02	土地补偿金
				齐彩强、何永强、周进武	1500	评审费
				凌辉建设工程咨询有限公司	7470	咨询费
				宁夏图新设计咨询有限公司	39026	监理费
				宁夏众业工程造价咨询有限公司	10000	咨询费
					4372	造价咨询



序号	单位名称	项目名称	到位资金 (元)	受托单位	支付金额 (元)	费用类别
				宁夏瑞拓建设工程有限公司	8000	方案编制费
					1561064.61	工程款
				宁夏朗石规划建筑设计院有限公司	15000	设计费
					20000	设计费

## 附件二：项目复核表

### 2020年大武口区一二三产业融合发展项目复核表

序号	单位名称	项目名称	受托单位	项目内容	立项	批复	政府采购方式	政府采购时间	合同价格、期限及签订时间	验收
1	大武口区沟口街道办事处	晒有田园综合体二期建设项目	宁夏融源建筑工程有限公司	翠柳社区导视牌、转盘铁艺雕塑、停车场、人行道铺装、磨坊屋面维修、蔬菜区沿线道路提升等	《关于大武口区晒有田园（二期）建设项目建设方案的立项申请》（石大沟办发〔2020〕6号）	《关于大武口区晒有田园（二期）建设项目建设方案的批复》（石大发改审发〔2020〕11号）	自行采购	2020年5月6日	合同价格：3294227.25； 合同期：2020年5月7日-2020年11月7日； 签订时间：2020年5月6日	验收时间：2020年11月16日； 验收结果：合格
			宁夏鹏程飞建设工程有限公司	造价咨询			自行采购	2020年4月27日	合同价格：152774； 合同期：2020年4月27日-2020年4月28日； 签订时间：2020年4月27日	
			杭州火石品牌策划有限公司	策划			自行采购	2021年1月15日	合同价格：600000； 合同期：2020年1月15日-2020年10月15日； 签订时间：2021年1月15日	
			福建瑞晟建筑工程造价咨询有限公司宁夏分公司	控制价审核			自行采购	2020年5月6日	合同价格：10198； 合同期：服务周期8天； 签订时间：2020年5月6日	

序号	单位名称	项目名称	受托单位	项目内容	立项	批复	政府采购方式	政府采购时间	合同价格、期限及签订时间	验收
			宁夏大地测绘科技有限公司	测绘			自行采购	2020年5月19日	合同价格: 15000; 合同期: 未约定; 签订时间: 2020年5月19日	
		大武口晒有田园特色种植产业发展扶持、大武口区民宿产业发展扶持	石嘴山市大武口区孙家苑家庭农场	中拱棚 7.4 亩补助 29600	《大武口晒有田园特色种植产业发展扶持政策》(石大政发[2020] 6号)、 《大武口区民宿产业发展扶持政策的通知》(石大政发[2020] 7号)	扶持资金	发放时间: 2020年12月15日	无合同	无验收	
	大武口区青青乐园农家乐		中拱棚 4.5 亩补助 18000;“一桌菜”补助 1500 元							
	王建梅(新硒望特色种植扶持资金)		中拱棚 4 亩补助 16000							
	黄继潭(紫川蔬菜园)		中拱棚 17.8 亩补助 71200							
	石嘴山市大武口区吴家大院农家乐		中拱棚 1.6 亩补助 6400; “一桌菜”补助 1500 元							
	刘增明(枣恋农庄)		“一朵花”补助 1000 元;“一件礼”补助 3000 元; “一个景”补助 2000 元							
	大武口区沟口园中苑农家乐		“一桌菜”补助 1500 元							
	王秀梅(梅杏桃园)		大拱棚 1.1 亩补助 6600; “一桌菜”补助 1500 元;“一个景”补助 2000 元							

序号	单位名称	项目名称	受托单位	项目内容	立项	批复	政府采购方式	政府采购时间	合同价格、期限及签订时间	验收
			马雪原(绿森淼特色种植)	“一桌菜”补助 1500 元;“一件礼”补助 3000 元						
			黄英杰(云翔家园)	“一桌菜”补助 1500 元						
2	星海镇星光村	食用醋厂加工配套项目	宁夏旭源建设工程有限公司	新建单层办公室、化验室以及原料库, 建筑面积 208.38 平方米; 新建单层发酵车间, 建筑面积 69.04 平方米等	《关于果园村、星光村发展壮大村集体经济项目的批复》(石大党组通〔2019〕57号)		公开招标	2019 年 11 月 14 日	合同价格: 1618305.69; 合同期: 2019 年 11 月 15 日-2020 年 5 月 13 日; 签订时间: 2019 年 11 月 15 日	验收时间: 2020 年 7 月 23 日; 验收结果《建设工程竣工验收报告》, 验收合格; 开工完工时间: 2019 年 11 月 10 日-
			宁夏瑞拓建设工程有限公司	新建门房公厕 1 座; 室外硬化、给排水、供暖管网、围墙等配套工程			公开招标	2021 年 3 月 15 日	合同价格: 1381544.16; 合同期: 2021 年 3 月 22 日-2021 年 5 月 6 日; 签订时间: 2021 年 3 月 22 日	未完工
			宁夏朗石规划建筑设计院有限公司(记账名称错误)	设计费			自行采购	2021 年 1 月 12 日	合同价格: 20000; 合同期: 2021 年 1 月 12 日以前; 签订时间: 2021 年 1 月 12 日	

序号	单位名称	项目名称	受托单位	项目内容	立项	批复	政府采购方式	政府采购时间	合同价格、期限及签订时间	验收
			苏金虎	镀锌管材、铜质散热片等材料费、安装费			自行采购	2020年10月28日	合同价格：105031； 合同期：2020年10月28日-2020年11月7日； 签订时间：2020年10月28日	
			大武口区尚农天润果蔬种植合作社	酿醋原料谷物、小麦37000斤（1.6元/斤）			自行采购	2020年10月15日	合同价格：根据市场价格； 合同期：2020年10月15日-2020年10月20日； 签订时间：2020年10月15日	
			大武口区尚农天润果蔬种植合作社	酿醋原料谷物、小麦37000斤（1.6元/斤）； 玉米27540斤（1.3元/斤）			自行采购	2020年10月15日	合同价格：根据市场价格； 合同期：2020年10月15日-2020年10月20日； 签订时间：2020年10月15日	
			宁夏澜淼商贸有限公司	反渗透净水机1台、风淋门1台			自行采购	2020年9月10日	合同价格：53695； 合同期：2020年9月10日； 签订时间：2020年9月10日	

序号	单位名称	项目名称	受托单位	项目内容	立项	批复	政府采购方式	政府采购时间	合同价格、期限及签订时间	验收
			宁夏商文化传媒有限公司	包装设计			自行采购	2020年12月1日	合同价格：30000； 合同期：2020年12月1日-2020年12月11日； 签订时间：2020年12月1日	
3	星海镇枣香村	现代温棚基础设施建设项目	宁夏环筑建设有限公司	新建8栋新型温棚，占地面积约9120平方米，拱棚2栋，2400㎡/栋，日光棚6栋720㎡/栋	《关于2020年发展壮大村集体经济项目的批复》（石大党组通〔2020〕26号）		公开招标	2020年6月6日	合同价格：2238662.68； 合同期：2020年6月9日-2020年7月24日； 签订时间：2020年6月10日	2021年2月5日《工程验收单》，验收合格。
			浙江公和建筑设计有限公司宁夏分公司	拱棚2400㎡，日光棚720㎡			自行采购	2020年5月1日	合同价格：25000； 合同期：未填写； 签订时间：2020年5月	
			银川正恒工程管理有限公司	监理			自行采购		合同价格：22386； 合同期：未填写； 签订时间：未填写	
			石嘴山市凯西测绘工程有限公司							
			宁夏智博科技有限公司	温棚智能设备采购及安装			自行采购	2020年10月29日	合同价格：161364； 合同期：2020年10月29日-2021年1月15日	未完工

序号	单位名称	项目名称	受托单位	项目内容	立项	批复	政府采购方式	政府采购时间	合同价格、期限及签订时间	验收
									签订时间:2020年10月29日	
			宁夏智博科技有限公司	智能物联监控项目			自行采购	2020年12月23日	合同价格:37807.54; 合同期:2020年12月23日-2021年1月7日 签订时间:2020年12月23日	未完工
			朱建龙							
			邵东厚							
			刘福生							
4	星海镇星海村	有机肥加工跑马场温棚观光	贾金平	装粪 2h*240=480 元、装风沙 66 车*60=3960 元、种树 11h*240=2640 元、种树 6h*220=1320 元、种树 30 车*60=1800 元、端肥料 10h*220=2200 元。	《关于 2019 年发展壮大村集体经济项目的批复》（石大党组通〔2019〕55 号）		自行采购	2020 年 3 月 20 日	合同价格:按每小时和每车计; 合同期:2020 年 3 月 24 日-2020 年 4 月 27 日; 签订时间:2020 年 3 月 20 日	2020 年 4 月 30 日,《马场种树竣工验收单》验收合格。(主管领导审核(镇)一栏签字)。

序号	单位名称	项目名称	受托单位	项目内容	立项	批复	政府采购方式	政府采购时间	合同价格、期限及签订时间	验收
		服务业项目	陈军	负4号地加渠 4.5h*160=720元			自行采购	2020年9月27日	无合同	2019年11月14日,《马场项目竣工验收单》验收合格。(主管领导审核(镇)一栏签字)。
	李永杜		4#地推地 16h*220=3520元、铲平土 3.5h*220=770元、装土 259车*20=5180元、23#地平整 8.5天*1600=13600元			自行采购	2019年12月5日	合同价格:按每天计; 合同期:2019年7月1日-2020年4月27日; 签订时间:2019年12月18日	2019年12月18日,《马场项目竣工验收单》验收合格。(主管领导审核(镇)一栏签字)。	
	谢东林		4#地挖渠 4h*160=640、4#地平地 26h*160=4160、4#地打埂 17h*160=2720、按泵及挖渠 1h*160=160、23#地打埂 13h*160=2080、挖电线沟 3.2h*160=512、23#地平整 8天*1300=10400			自行采购	2019年6月25日	合同价格:按每小时计; 合同期:2019年6月28日-2019年12月16日; 签订时间:2019年6月25日	2019年12月18日,《马场项目竣工验收单》验收合格。(主管领导审核(镇)一栏签字)。	
	蒙勤花		4#地灌渠 8h*160=1280			自行采购			2019年7月23日,《马场项目竣工验收单》验收合格。(主管领导审核(镇)一栏签字)。	



序号	单位名称	项目名称	受托单位	项目内容	立项	批复	政府采购方式	政府采购时间	合同价格、期限及签订时间	验收
				4#地灌渠 2h*160=320、 23#地拉水泵 2h*160=320、马场边挖 渠 5h*160=800			自行采购			2019年7月29日, 《马场项目竣工 验收单》验收合 格。(主管领导审 核(镇)一栏签 字)。
			杨小红	农用汽车(宁 b85893)拉 土 19车*40=760、23#地 平整场地 2h*160=320、 4#地挖渠 3.5*160=560			自行采购			2019年12月18 日,《马场项目竣 工验收单》验收合 格。(主管领导审 核(镇)一栏签 字)。
			杨剑	装土 110车*20=2200、 平整场地 5天 *1300=6500			自行采购	2019年 12月12 日	合同价格:按每天计; 合同期:2019年9月 10日-2019年12月 17日; 签订时间:2019年12 月12日	2019年12月17 日,《马场项目竣 工验收单》验收合 格。(主管领导审 核(镇)一栏签 字)。
			魏斌	转石头 1.5天*800=1200			自行采购			2019年12月17 日,《马场项目竣 工验收单》验收合 格。(主管领导审 核(镇)一栏签 字)。

序号	单位名称	项目名称	受托单位	项目内容	立项	批复	政府采购方式	政府采购时间	合同价格、期限及签订时间	验收
			魏鹏	拉土 (宁 b86708)119 车 *40=4760、拉土 27 车 *40=1080、拉土 259 车 *40=10360、拉土 45 车 *40=1800、转风沙 1 天 *800=800			自行采购	2019 年 9 月 10 日	合同价格: 按每车计; 合同期: 2019 年 9 月 14 日-2019 年 12 月 18 日; 签订时间: 2019 年 9 月 10 日	2019 年 12 月 18 日, 《马场项目竣工验收单》验收合格。(主管领导审核(镇)一栏签字)。
			张海军	4#地打埂 15h*160=2400			自行采购	2019 年 11 月 7 日	合同价格: 按每小时计; 合同期: 2019 年 11 月 12 日-2019 年 11 月 13 日; 签订时间: 2019 年 11 月 7 日	2019 年 11 月 12 日, 《马场项目竣工验收单》验收合格。(主管领导审核(镇)一栏签字)。
			李鱼子	拉土(宁 b86079) 3.5h*800=2800			自行采购	2019 年 11 月 13 日	合同价格: 按每天计; 合同期: 2019 年 12 月 15 日-2019 年 12 月 18 日; 签订时间: 2019 年 11 月 13 日	2019 年 12 月 18 日, 《马场项目竣工验收单》验收合格。(主管领导审核(镇)一栏签字)。
			柳强	转石头 (宁 b98769) 68 车*40=2720			自行采购	2019 年 10 月 19 日	合同价格: 按每车计; 合同期: 2019 年 10 月 22 日-2019 年 10 月 24 日; 签订时间: 2019 年 10 月 19 日	2019 年 10 月 24 日, 《马场项目竣工验收单》验收合格。(主管领导审核(镇)一栏签字)。

序号	单位名称	项目名称	受托单位	项目内容	立项	批复	政府采购方式	政府采购时间	合同价格、期限及签订时间	验收
			李永聪	拉土 (宁 b25982)76 车 *40=3040			自行采购	2019 年 10 月 20 日	合同价格: 按每车计; 合同期: 2019 年 10 月 25 日-2019 年 10 月 25 日; 签订时间: 2019 年 10 月 20 日	2019 年 10 月 25 日, 《马场项目竣 工验收单》验收合 格。(主管领导审 核(镇)一栏签 字)。
			杜金红	打埂 122 埂*15=1830			自行采购			2019 年 12 月 13 日, 《马场项目竣 工验收单》验收合 格。(主管领导审 核(镇)一栏签 字)。
			张骥	马场平场地 3 天 *1300=3900			自行采购	2019 年 12 月 12 日	合同价格: 按每天计; 合同期: 2019 年 12 月 15 日-2019 年 12 月 17 日; 签订时间: 2019 年 12 月 12 日	2019 年 12 月 18 日, 《马场项目竣 工验收单》验收合 格。(主管领导审 核(镇)一栏签 字)。
			党严举	23#地做渠 7.5 天 *1300=9750			自行采购	2019 年 12 月 1 日	合同价格: 按每天计; 合同期: 2019 年 12 月 9 日-2019 年 12 月 16 日; 签订时间: 2019 年 12 月 1 日	2019 年 12 月 17 日, 《马场项目竣 工验收单》验收合 格。(主管领导审 核(镇)一栏签 字)。

序号	单位名称	项目名称	受托单位	项目内容	立项	批复	政府采购方式	政府采购时间	合同价格、期限及签订时间	验收
			吴三锁	挖十五斗渠 13h*160=2080、23#地平 整 2.5 天*1300=3250			自行采购	2019 年 12 月 12 日	合同价格: 按每天计; 合同期: 2019 年 12 月 13 日-2019 年 12 月 16 日; 签订时间: 2019 年 12 月 12 日	2019 年 12 月 17 日, 《马场项目竣 工验收单》验收合 格。(主管领导审 核(镇)一栏签 字)。
			柳浩	23#地做渠 9 天 *1600=14400			自行采购	2019 年 12 月 2 日	合同价格: 按每天计; 合同期: 2019 年 12 月 8 日-2019 年 12 月 16 日; 签订时间: 2019 年 12 月 2 日	2019 年 12 月 17 日, 《马场项目竣 工验收单》验收合 格。(主管领导审 核(镇)一栏签 字)。
			宁夏博达劳 务有限公司 (岳喜便)	修建马场			自行采购			
			王红	移动舞台费及车费			自行采购			
			张银山	代垫电费			自行采购	2019 年 10 月 1 日	合同价格: 合同期: 从 2019 年 10 月 1 日起; 签订时间: 2019 年 10 月 1 日	无验收
			星海村	电缆 200 米*21=4200、 铜铝镍 8 个*5=40、空气 开关 1 个*190=190、电 线 1 卷*280=280、铝电 线 1 卷*180=180、配电 器 1 个*70=70			自行采购			

序号	单位名称	项目名称	受托单位	项目内容	立项	批复	政府采购方式	政府采购时间	合同价格、期限及签订时间	验收
			合作社马场人员	马红霞 7-10 月实发 4000、马金鑫 7-10 月实发 4000、尹志科 7-10 月实发 9000、张崇安 7-8.15 实发 2250、邵岁弟 7.15-10 月实发 7000			自行采购			
			马学虎	稻草 15.86 吨 *800=12688			自行采购	2020 年 11 月 13 日	合同价格: 12688 合同期: 未有合同期 签订时间: 2020 年 11 月 13 日	无验收
			董小龙	文艺演出赔偿金			自行采购			
				马场场地碾压施工费			自行采购			
			王晓青	收割青锄玉米机耕费			自行采购			
				购买办公桌椅贷款			自行采购			
			张银山	马场开业购置彩旗			自行采购			
				沙发、茶几			自行采购			
				马场十一交流会临时工工资			自行采购			

序号	单位名称	项目名称	受托单位	项目内容	立项	批复	政府采购方式	政府采购时间	合同价格、期限及签订时间	验收
				玉米地灌水费			自行采购			
			马学虎	马场拉草			自行采购			
				购买炉子、烟筒、铲子			自行采购			
			薛云露	145 亩*70.34=10200			自行采购			
			李俊祥	23 号玉米地管理人员李俊祥 6 月 (13 天) -10 月 (10 天) 工资 7532			自行采购			
			郭家权	马场临时工 10 月 (15 天) -11 月 (19 天) 共计 2720			自行采购			
5	星海镇果园村	民俗园垂钓采摘项目	宁夏吉润建设工程有限公司	文化园室内装修费	《关于果园村发展壮大村集体经济项目的批复》(石大党组通〔2019〕57号)、(石大发发改〔2019〕172号)	自行采购	2020年8月24日	合同价格: 201000; 合同期: 2020年8月20日-2020年9月25日; 签订时间: 2020年8月24日	2020年10月22日《工程竣工验收单》, 验收合格。	
			张满库	渔湖开挖项目		自行采购	2020年5月20日	合同价格: 119950; 合同期: 2020年5月20日-2020年7月20日; 签订时间: 2020年5月20日	2020年9月6日《工程竣工验收单》, 验收合格。	

序号	单位名称	项目名称	受托单位	项目内容	立项	批复	政府采购方式	政府采购时间	合同价格、期限及签订时间	验收
			魏鹏军	压路机租赁一天 1500 元、砂石转运共计 10 车, 每车 1000 元费			自行采购			
			平罗县诚德瑞工程机械租赁部	机械租赁费			自行采购			
			宁夏众象广告传媒有限公司	制作水深警示牌			自行采购			
			银川市金国厨酒店用品批发部	购买厨具			自行采购			
6	星海镇富民村	设施日光温室项目	银川市第一建筑工程有限公司	新建 6 栋新型温棚, 占地面积约 4800 m <sup>2</sup> , 其中日光棚 6 栋, 每棚种植面积 960 m <sup>2</sup>	《关于 2020 年发展壮大村集体经济项目的批复》(石大党组通〔2020〕26 号)		公开招标	2020 年 6 月 4 日	合同价格: 1812857.78; 合同期: 2020 年 6 月 30 日-2020 年 7 月 29 日; 签订时间: 2020 年 6 月 30 日	验收时间: 验收结果: 合格; 开工完工时间: 2020 年 6 月 18 日-2020 年 8 月 18 日
7	长胜街道潮湖村、龙泉村、长胜村	潮湖村瑞宝葫芦非遗研学农村一二三	邓彦田	付甲方代表邓彦田 (5-7 月) 劳务费 1738.67			自行采购	2020 年 6 月 3 日	合同价格: 每月 4000 ; 合同期: 2020 年 5 月 1 日-2021 年 4 月 30 日; 签订时间: 2020 年 6 月 3 日	
				付甲方代表邓彦田 (8-10 月) 劳务费 12000						
				龙泉村美丽家园建设甲方代表邓彦田劳务费 (2020 年 11 月-2021 年 1 月份)						

序号	单位名称	项目名称	受托单位	项目内容	立项	批复	政府采购方式	政府采购时间	合同价格、期限及签订时间	验收
		产业融合发展基地一期、龙泉村特色民宿附属工程等、长胜村光伏养牛场	宁夏正乙实业有限公司	维修破损路面 3500 平方米, 铺设水泥砖 11000 平方米, 安装围栏 2500 米, 新建广场 1000 平方米; 维修改造水塘, 建设水系 4000 平方米; 绿化荒山, 绿化面积 200 亩; 建设景观亭 3 个		《关于龙泉村乡村旅游特色民宿-附属工程项目建设方案的批复》(石大发改发[2019]205号)			合同价格: 3176828.96; 合同期: 未填写合同期 签订时间: 2019 年 11 月 19 日	2020 年 6 16 日《建设工程竣工验收报告》, 验收合格
			宁夏旭升建筑工程有限公司	广场铺设透水砖、面包砖、砌筑假山及水系喷泉、搭建凉亭花架		《关于石嘴山市大武口区长胜街道办事处美丽家园建设可行性研究报告的批复》(石大发改法[2018]47 号)			合同价格: 2451523.31 ; 合同期: 2019 年 6 月 5 日 -2019 年 7 月 10 日 签订时间: 2019 年 6 月 1 日	2019 年 7 月 10 日《工程竣工验收单》, 验收合格
			微微新娘婚纱店	大武口区微微新娘婚纱店龙泉村第二届休闲乡村美食文化旅游开幕式主持人服装造型费			自行采购	2020 年 9 月 25 日	合同价格: 1000; 合同期: 2020 年 10 月 1 日; 签订时间: 2020 年 9 月 25 日	
			大武口区摄影家协会	大武口区摄影家协会龙泉村美丽乡村建设图片及视频服务费			自行采购	2021 年 1 月 6 日	合同价格: 16187.5; 签订时间: 2021 年 1 月 6 日	
			宁夏嘉盛建设有限公司	建设 500 平方米轻钢镀轻钢房屋, 房屋主体采用 T550 钢材龙骨, 外墙面 1.0 毫米欧版加固, 外墙用 1.6cm 金属保温雕花板为外墙等			自行采购	2019 年 8 月 29 日	合同价格: 725000; 合同期: 开工 30 工作日; 签订时间: 2019 年 8 月 29 日	2020 年 5 月 20 日《工程竣工验收单》, 验收合格



序号	单位名称	项目名称	受托单位	项目内容	立项	批复	政府采购方式	政府采购时间	合同价格、期限及签订时间	验收
			银川长城工程监理有限公司	龙泉村美丽家园观光厅工程监理费			自行采购	2019年8月1日	合同价格：19638； 合同期：2019年8月1日-2019年12月10日； 签订时间：2019年8月1日	
			宁夏众合泰建筑工程有限公司	建设500平方米轻钢镀轻钢房屋，房屋主体采用T550钢材龙骨，外墙面1.0毫米欧版加固，外墙用1.6cm金属保温雕花板为外墙等			自行采购	2020年3月10日	合同价格：95748.84； 合同期：2020年3月10日-2020年5月10日； 签订时间：2020年3月10日	2020年5月20日《工程竣工验收单》，验收合格
			宁夏中建天宏工程咨询有限公司	龙泉村美丽乡村停车场及周边环境整治工程控制价编制费			自行采购	2020年9月16日	合同价格：17514； 合同期：2020年9月16日-2020年9月20日； 签订时间：2020年9月16日	
			宁夏众业工程造价咨询有限公司	大武口区儿童创新素养体验基地项目工程量清单及控制价编制费			自行采购	2020年12月31日	合同价格：35892； 合同期：2020年12月31日-2021年1月5日； 签订时间：2020年12月31日	

序号	单位名称	项目名称	受托单位	项目内容	立项	批复	政府采购方式	政府采购时间	合同价格、期限及签订时间	验收
			宁夏鸿建建设监理有限公司	龙泉村特色名宿-附属工程监理费			自行采购	2019年7月29日	合同价格：58262； 合同期：2019年7月29日-2019年9月15日； 签订时间：2019年7月29日	
			宁夏鸿建建设监理有限公司	龙泉村路灯亮化工程监理费			自行采购	2020年9月8日	合同价格：29594； 合同期：2020年9月8日-2020年9月30日； 签订时间：2020年9月8日	
			宁夏鸿建建设监理有限公司	龙泉村美丽乡村停车场及周边环境整治监理费			自行采购	2020年9月25日	合同价格：50148； 合同期：2020年9月25日-2020年11月4日； 签订时间：2020年9月25日	
			宁夏正彦建设项目管理有限公司	大武口区龙泉村路灯亮化工程结算审核费			自行采购	2020年10月26日	合同价格：20082； 合同期：2020年10月26日-2020年11月30日； 签订时间：2020年10月26日	
			四川振鸿工程项目管理有限公司宁夏分公司	大武口区套柴沟整治及周边环境治理设计费			自行采购	2020年11月1日	合同价格：68065.9； 合同期：50年； 签订时间：2020年11月	

序号	单位名称	项目名称	受托单位	项目内容	立项	批复	政府采购方式	政府采购时间	合同价格、期限及签订时间	验收
				大武口区套柴沟整治及周边环境治理测量费			自行采购		合同价格: 18058.3; 签订时间: 2020年11月	
			宁夏中建天宏工程咨询有限公司	石嘴山市大武口区桃柴沟整治及周边环境治理项目控制价编制费			自行采购	2020年11月5日	合同价格: 12405; 合同期: 2020年11月5日-2020年11月8日; 签订时间: 2020年11月5日	
			宁夏鸿建建设监理有限公司	大武口区桃柴沟整治及周边环境治理项目监理费			自行采购	2020年11月12日	合同价格: 35892; 合同期: 2020年11月12日-2020年12月12日; 签订时间: 2020年11月12日	
			山东正方建设项目管理有限公司银川分公司	大武口区桃柴沟整治及周边环境治理项目控制价审核费			自行采购	2020年11月9日	合同价格: 7983; 合同期: 2020年11月9日-2020年11月11日; 签订时间: 2020年11月9日	
			宁夏正彦建设项目管理有限公司	石嘴山市大武口区桃柴沟整治及周边环境治理项目结算审核费			自行采购	2020年12月15日	合同价格: 34744; 合同期: 2020年12月15日-2020年12月30日 签订时间: 2020年12月15日	

序号	单位名称	项目名称	受托单位	项目内容	立项	批复	政府采购方式	政府采购时间	合同价格、期限及签订时间	验收
8	长兴街道兴民村	兴民村畜禽粪污资源化利用项目、八大庄一二三产业融合发展示范工程、兴民村农产品加工销售仓储物流园建设项目	路金宝	农田、羊圈	《关于兴民村农产品加工销售仓储物流园建设项目建设方案的批复》(石大发改审发[2020]50)		自行采购	2020年11月7日	合同价格: 14586.98; 签订时间: 2020年11月7日	2021年1月22日 《工程竣工验收单》, 验收合格。
			陆金良	羊圈、住房、围墙等			自行采购	2020年11月7日	合同价格: 185413.02; 签订时间: 2020年11月7日	
			齐彩强、何永强、周进武	停车场仓储物流园项目专家评审						
			凌辉建设工程有限公司	停车场仓储物流园项目控制价编制			自行采购	2020年8月19日	合同价格: 7470; 合同期: 2020年8月19日-2020年8月26日; 签订时间: 2020年8月19日	
			宁夏图新设计咨询有限公司	停车场仓储物流园项目监理			自行采购	2020年9月25日	合同价格: 39026; 合同期: 2020年9月25日-2020年11月5日; 签订时间: 2020年9月25日	
			宁夏众业工程造价咨询有限公司	停车场仓储物流园项目结算审计费			自行采购		合同价格: 10000; 合同期: 2021年1月22日-2021年1月27日; 签订时间: 未填写	

序号	单位名称	项目名称	受托单位	项目内容	立项	批复	政府采购方式	政府采购时间	合同价格、期限及签订时间	验收
				停车场仓储物流园项目 控制价审核			自行采购		合同价格：4372； 合同期：2020年8月 26日-2020年9月4 日； 签订时间：未填写	
			宁夏瑞拓建 设工程有限 公司	停车场仓储物流园项目 方案编制			自行采购	2020年 10月15 日	合同价格：8000； 合同期：2020年10 月15日-2020年10 月25日； 签订时间：2020年10 月15日	
				加工销售仓储物流园，建 筑面积为1128.50平方 米，新建农产品加工车间 为地上一层坡屋顶建筑， 道路硬化300平方米			公开招标	2020年9 月24日	合同价格： 1561064.61； 合同期：未填写； 签订时间：未填写	
			宁夏朗石规 划建筑设计 院有限公司	停车场仓储物流园项目 图纸设计费			自行采购		合同价格：15000 ； 合同期：合同签订30 日内 签订时间： 未填写	
				停车场仓储物流园项目 建设方案设计费			自行采购	2020年7 月1日	合同价格：20000 ； 合同期：合同签订10 日内 签订时间： 2020年7月1日	

### 附件三：指标体系评分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	细化量化指标	评价标准	分值
项目决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2.00	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目符合自治区“十三五”规划，符合《宁夏回族自治区地方政府债券管理办法》（宁政办发〔2014〕102号），得满分；每不符合一项，扣权重的1/2，扣完为止。	2.00
		立项程序规范性	3.00	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。项目申报是否充分考虑风险因素。	①项目按照规定的程序申请设立； ②事前已经过必要的前期调研且有效等； ③是否根据项目出具融资平衡报告、财务评估报告、法律意见书。符合所有条件得满分，每不符合一项，扣权重的1/3，扣完为止。	2.00
	项目目标 (6分)	绩效目标合理性	3.00	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合所有条件得满分，每不符合一项，扣权重的1/4，扣完为止。	3.00
		绩效指标明确性	3.00	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①项目绩效目标与项目实施内容联系紧密； ②项目单位填报绩效目标申报表且将项目绩效目标细化分解为具体的数量、质量、时效、效果等绩效指标； ③项目绩效指标具体、细化，标杆值依据充分。符合所有条件得满分，每不符合一项，扣权重的1/3，扣完为止。	1.00
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	2.00	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算安排有明确得数量和单价； ②数量和单价依据充分； ③符合项目实施计划。 每个项目符合所有条件得满分，每不符合一项，不得分。得分=实际符合条件项目个数/8*权重	1.50

		资金分配合理性	2.00	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①资金分配办法健全、规范,因素选择全面、合理; ②项目实施符合相关资金分配办法,资金分配的审批程序和手续完整、规范,资金分配合理、合规。 符合所有条件得满分,每不符合一项,扣权重的 1/2,扣完为止。	1.00
项目 过程 (24 分)	资金管理 (14分)	资金到位率	3.00	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度,资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	得分=资金到位率×权重。	3.00
		预算执行率	4.00	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况,预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。	预算执行率[100%,95%],得满分;预算执行率低于 95%或高于 100%,每偏差 1%扣权重的 2.5%,扣完为止。	3.64
		资金使用合规性	4.00	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况。	①项目资金符合有关使用流程规定的,得满分的 1/3,出现不符合有关使用流程规定的,资金使用合规性指标得 0 分; ②财政资金做到专款专用,得满分的 1/3,财政资金未做到专款专用的,资金使用合规性指标得 0 分; ③未出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象,得满分的 1/3,出现以上现象资金使用合规性指标得 0 分。	3.50
		财务管理规范性	3.00	项目承担单位是否规范财务管理,是否严格按照预算科目列支经费	①规范财务管理; ②财务档案资料齐全; ③严格按照预算科目列支经费。 符合所有条件得满分,缺失一项扣权重的 1/3,扣完为止。	2.50
	组织实施 (10分)	组织机构	1.00	机构是否健全、分工是否明确。	①机构健全; ②分工明确。 符合所有条件得满分,缺失一项扣权重的 1/2,扣完为止。	1.00
		政府采购管理	2.00	考察项目是否符合相关政策要求,是否公平公开,给予各服务单位同等竞争机会。	①执行了政府采购程序;②招标文件需求明确;③招标文件中无限制性条款;④无因招标文件产生的废标和重复招标的情况;⑤无采购方或招标方有责质疑投诉。满足所有条件,得满分,每缺少 1 项,扣权重 1/5,扣完为止。	2.00

		合同管理		3.00	考察项目是否按要求订立相关服务合同，合同约定要素和内容是否完整。	①与供应商签订合同；②合同内容包括：服务内容、服务期限、服务质量、付款方式和违约责任；③合同各方均履行合同约定；每不符一项，扣权重的 1/3，扣完为止。	1.50
		验收管理		3.00	考察验收管理制度及验收结果反馈制度是否健全并根据相应内容执行。	项目制定了完善的验收管理制度及验收结果反馈制度；委托项目严格按照相应制度执行,并完成验收。三个标段均符合所有条件得满分，有一个标段不符合扣权重的 1/3，扣完为止。	3.00
		档案管理		1.00	考察项目是否建立了档案管理制度并根据相应制度执行。	①项目建立了完善的档案管理制度； ②项目相关方根据相应制度执行。 符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的 1/2，扣完为止。	1.00
项目 产出 (24 分)	产出数量	晒有田园综合体二期建设项目	晒有田园	2.00	建设晒有田园 1 个。包括：翠柳社区导视牌 1 座、转盘铁艺雕塑 1 座、沟口集市标识牌 1 座、停车场 2500 m <sup>2</sup> 、人行道铺装 100 m <sup>2</sup> 、面包砖铺装 2000 m <sup>2</sup> 、永道牙铺装 560m、仿真竹帽 20 个、木栅栏花池 186m，磨坊屋面维修 100 m <sup>2</sup> 、蔬菜区沿线道路提升 2000m 等	<p>实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 得分=实际完成率*权重</p>	2.00
		特色种植产业发展扶持项目	奖补特色种植产业	1.00	奖补大拱棚 1.1 亩、中拱棚 31.3 亩、一桌菜 6 个单位、一朵花 1 个单位、一件礼 2 个单位、一个景 2 个单位		1.00
		食用醋厂加工配套项目	食用醋厂门房及公厕	1.00	门房 1 座、公厕 1 座		1.00
		枣香村现代温棚基础设施建设项目	新型温棚	1.00	拱棚 2 栋、日光棚 6 栋、智能物联监控		0.50
		跑马场项目	跑马场	1.00	300 多亩场地平整		1.00
		移动舞台演出	移动舞台演出	1.00	演出 14 天		1.00
		民俗园垂	文化园室内装	1.00	10 室 580 m <sup>2</sup>		1.00




	钓采摘项目	修				
	渔湖开挖项目	渔湖	1.00	开挖渔湖 1 个		1.00
	富民村设施日光温室项目	日光棚	1.00	6 栋		1.00
	龙泉村乡村旅游特色民宿-附属工程项目	龙泉村乡村旅游特色民宿-附属工程	2.00	硬化砼道砖铺装 500 平方米, 砼硬化 50 平方米, 花岗岩铺装 300 平方米停车场, 透水砖铺装 600 平方米, 花岗岩丁步 100 平方米, 围墙及大门 380 米, 绿化林木 26350 株, 草坪 2300 平方米, 安装 LED 路灯 17 套, 路灯控制柜 1 套等		2.00
	龙泉村美丽家园建设景观节点改造提升工程	龙泉村美丽家园广场景观节点改造提升工程	2.00	维修破损路面 3500 平方米, 铺设水泥砖 11000 平方米, 安装围栏 2500 米, 新建广场 1000 平方米; 维修改造水塘, 建设水系 4000 平方米; 绿化荒山, 绿化面积 200 亩; 建设景观亭 3 个		2.00
	兴民村农产品加工销售仓储物流园建设项目	新建标准化厂房	1.00	1 个		1.00
		道路硬化	1.00	300 m <sup>2</sup>		1.00
产出质量	验收合格率		4.00	100%	验收合格率= (验收合格数/实际申报数) ×100%。 验收合格数: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 得分=验收合格率*权重。	3.00
产出时效	工程完工及时性		4.00	100%	工程完工及时性=实际建设时间符合数量/计划建设时间符合数量*100%。	3.50


					得分=建设时间完成及时率*权重		
项目 效益 (37 分)	经济效益	食用醋厂加工配套项目	收入增加	3.00	建设初期维持运营	建设初期能够维持运营得满分；建设初期有一定收入，但无法维持运营，得 1-2 分；未获得收入或项目停运，不得分。	1.00
		枣香村现代温棚基础设施建设项目	收入逐年增加	3.00	转租 8 栋温棚获取租金，第一年 6000 元/栋，计 4.8 万元；第二年 7000 元/栋，计 5.6 万元；第三年 8000 元/栋，计 6.4 万元。拱棚 2 栋租赁标准，第一年 2.16 万/栋，计 4.32 万；第二年 2.5 万元/栋，计 5 万元；第三年 2.9 万元/栋，计 5.8 万元。	转租能够获取租金，且收入逐年增加，得满分；转租收入较低，但是在带动相关产业发展方面能够发挥作用，得 1-2 分；未获得收入或项目停运，不得分。	3.00
		跑马场项目	收入增加	2.00	建设初期维持运营	建设初期能够维持运营得满分；建设初期有一定收入，但无法维持运营，得 1-2 分；未获得收入或项目停运，不得分。	0.00
		民俗园垂钓采摘项目	收入增加	2.00	建设初期维持运营	建设初期能够维持运营得满分；建设初期有一定收入，但无法维持运营，得 1-2 分；未获得收入或项目停运，不得分。	0.00
		富民村设施日光温室项目	收入逐年增加	2.00	转租 6 栋日光温室获取租金，第一年 7000 元/栋，计 4.2 万元；第二年和第三年 8000 元/栋，计 4.8 万元；第四年至承包期在 8000 元基础上递增 5%，8400 元/栋，计 5.04 万元，承包期 5 年	转租能够获取租金，且收入逐年增加，得满分；转租收入较低，但是在带动相关产业发展方面能够发挥作用，得 1-2 分；未获得收入或项目停运，不得分。	2.00
		兴民村农产品加工销售仓储物流园建设项目	获取稳定收入	3.00	转租获取租金，停车场 5 万元/年，厂房 7 万元/年	转租能够获取租金，且收入逐年增加，得满分；转租收入较低，但是在带动相关产业发展方面能够发挥作用，得 1-2 分；未获得收入或项目停运，不得分。	1.00
	社会效益	硒有田园综合体二期建设项目	带动相关产业发展	4.00	带动富硒大米、富硒瓜菜等产业发展	通过项目的实施对带动富硒大米、富硒瓜菜等产业发展等各方面有积极影响的得满分；若通过项目的实施对社会效益影响一般的扣权重的 50%；若通过项目的实施对社会效益造成消极影响的不得分。	4.00

	特色种植产业发展扶持项目	鼓励发展创意农业	3.00	调动广大农民、经营主体积极投入大棚种植、引进新品种、产品深加工等产业项目，促进农业发展和农民增收	通过项目的实施对调动广大农民及经营主体积极投入大棚种植、引进新品种、产品深加工等产业项目，对促进农业发展和农民增收等各方面有积极影响的得满分；若通过项目的实施对社会效益影响一般的扣权重的 50%；若通过项目的实施对社会效益造成消极影响的不得分。	3.00
	龙泉村乡村旅游特色民宿-附属工程项目、龙泉村美丽家园建设项目	带动辖区居民就业	4.00	社会投资增多，带动辖区居民就业，增加村民收入	通过项目的实施对吸引社会投资、带动辖区居民就业、增加村民收入等各方面有积极影响的得满分；若通过项目的实施对社会效益影响一般的扣权重的 50%；若通过项目的实施对社会效益造成消极影响的不得分。	4.00
可持续影响 (3分)	长效管理机制健全有效		5.00	健全有效	建立并健全了相应长效管理机制的，且执行有效的，得满分；建立了长效管理机制但不完善的，扣权重的 50%；未建立长效管理机制的，不得分。	3.00
满意度	受益群众满意度		6.00	≥90%	根据问卷调查中满意度问题进行评分。满意度 90%以上，得满分；低于 90%，每偏差 1%扣权重的 2.5%，扣完为止。得分=权重分*满意度。	5.79
合计			100.00			80.43


# 附件四：项目负责人访谈提纲


  
 兴民村农产品加工销售仓储物流园建设项目  
 相关管理人员访谈提纲


1. 请简要介绍一下一二三产业发展资金使用情况？（预算资金多少？支出多少？）  
 财政拨付 50 万元，支出 509428 元，不足资金用村集体经济发展资金支付
2. 项目是否填报目标申报表？是否有发改局批复文件？  
 发改局未批复
3. 请介绍一下本项目的经济效益？  
 将 6 栋日光温室进行租赁，标准为：第一年每栋为 7000 元，计 4.2 万元；第二年与第三年每栋为 8000 元，计 4.8 万元；第四年至承包期在 8000 元基础上递增 5%，每栋为 8400 元，计 50400 元，承包期为 5 年。
4. 请介绍一下本项目的社会效益？  
 引进新技术、新品种，带动本村残疾及低保人员就业问题，长期解决就业人数为 6 人，临时就业人数 50 人左右。
5. 请简要介绍一下项目后续（维护、管理）长效管理机制？  
 以租赁方式租赁给村民合作社，由合作社自行运营管理，村委会负责监督检查，确保租赁方按照合同要求运作。


  
 兴民村农产品加工销售仓储物流园建设项目  
 相关管理人员访谈提纲

1. 请简要介绍一下一二三产业发展资金使用情况？（预算资金多少？支出多少？）  
 2020 年度该项目到位资金 200 万元，其中 20 万元用于八大庄一二三产业融合发展项目征地，180 万元用于农产品加工销售仓储物流园建设项目。  
 八大庄一二三产业融合发展项目于 2020 年 11 月 20 日已支付征地费用 20 万元；截止 2021 年 2 月 9 日农产品加工销售仓储物流园建设项目资金已支付资金 1666432.61。
2. 项目是否填报目标申报表？是否有发改局批复文件？  
 该项目已按要求填报目标申报表并报财政，项目有发展批复文件。
3. 请介绍一下本项目的经济效益？  
 已于 2021 年 4 月与第三方签订《承租协议》，停车场每年 5 万元租金，2021 年已支付，物流仓储园每年 7 万元，由于尚未完成消防验收，租金暂未收到。
4. 请介绍一下本项目的社会效益？  
 可增加村集体收入，带动周边农户就业。
5. 请简要介绍一下项目后续（维护、管理）长效管理机制？  
 以承租租赁方式由第三方进行维护和管理，村委会负责监管。


  
 潮湖村瑞宝葫芦非遗研学农村一二三产业融合发展基地一期、龙泉村特色名宿附属工程等、长胜村光伏养牛场项目  
 相关管理人员访谈提纲

1. 请简要介绍一下一二三产业发展资金使用情况？（预算资金多少？支出多少？）  
 预算 300 万元，已支出 300 万元。
2. 项目是否填报目标申报表？是否有发改局批复文件？  
 是，有批复。
3. 请介绍一下本项目的经济效益？  
 龙泉村成功创建国家 3A 级旅游景区，年接待游客 60 万人次，实现营业收入 620 万元。
4. 请介绍一下本项目的社会效益？  
 带动 50 余人实现家门口就业，村民人均收入由 1 万元提升至 1.9 万元。
5. 请简要介绍一下项目后续（维护、管理）长效管理机制？  
 继续完善建设，探索乡村旅游管理进一步提升村旅游品质。


  
 稻有田园综合体二期建设项目相关管理人员访谈提纲

1. 请简要介绍一下一二三产业发展资金使用情况？（支出多少？剩余资金未支付原因？剩余资金支付计划？）  
 2020 年 7 月收区财政局拨付 300 万元一二三产业发展资金，用于支付稻有田园二期支出，已支出 2536447 元，剩余 463553 元，剩余资金预计用于支付稻有田园项目下一步建设。
2. 项目是否填报目标申报表？  
 已填报 2020 年农村一二三产业融合发展补助资金绩效目标申报表。
3. 请介绍一下本项目的经济效益？  
 通过完善基础设施、丰富旅游业态，大力发展富硒产业，如优质富硒大米、富硒瓜果等，并推动休闲采摘和观光旅游，农产品附加值大幅提升，辖区果园农庄增收超过 20%。
4. 请介绍一下本项目的社会效益？  
 大武汉稻有田园建成后农业和旅游基础会大幅提升，辖区环境面貌明显改善，一二三产业融合发展更加紧密，社会各种投资力度明显增大，就业创业活力进一步增强，带动辖区快速发展。
5. 请简要介绍一下项目后续（维护、管理）长效管理机制？  
 持续对稻有田园内基础设施进行完善，不断丰富旅游业态，吸引游客前来观光旅游，促进辖区居民增收。

**星海镇果园村民俗园垂钓采摘项目  
相关管理人员访谈提纲**

1. 请简要介绍一下一二三产业发展资金使用情况？（预算资金多少？支出多少？）  
收入 35 万，支出 347070 元。

2. 项目是否编制目标申报表？是否有发改局批复文件？  
无目标申报表，无发改局批复文件

3. 请介绍一下本项目的经济效益？  
项目投入 185 万，项目于 2020 年 10 月开始运营，截止 2021 年 8 月底，项目 6 万多，项目尚未获取利润。

4. 请介绍一下本项目的社会效益？  
带动村民就业，项目的实施改善了农村环境面貌。

5. 请简要介绍一下项目后续（维护、管理）长效管理机制？  
项目现在由合作社管理，后期计划承包给单位和个人开发、使用。

**星海镇果园村民俗园垂钓采摘项目  
相关管理人员访谈提纲**

1. 请简要介绍一下一二三产业发展资金使用情况？（预算资金多少？支出多少？）  
财政拨款 150 万，支出 1046772.9 元

2. 项目是否编制目标申报表？是否有发改局批复文件？  
发改局未批复

3. 请介绍一下本项目的经济效益？  
将 8 栋温棚进行租赁，标准为：第一年每栋温棚 6000 元，计 48000 元；第二年递增 16.67% 左右，计每栋温棚每年 7000 元，计 56000 元；第三年递增 14.28%，计每栋温棚每年 8000 元，计 64000 元；拱棚 2 栋租赁标准为：第一年 21600 元，43200 元，第二年递增 15.74%，计每栋温棚每年 25000 元，计 50000 元；第三年递增 16%，计每栋温棚每年 29000 元，计 58000 元，合计第一年收入 91200 元，第二年收入 106000 元，第三年收入 122000 元。

4. 请介绍一下本项目的社会效益？  
引进新技术、新品种，试验示范推广，带动辐射就业和种植户 50 户

5. 请简要介绍一下项目后续（维护、管理）长效管理机制？  
以租赁方式租赁给合作社，由合作社自行运行管理，村委会只负责监督检查，确保租赁方按照合同要求运作。

**食用醋厂加工配套项目相关管理人员访谈提纲**

1. 请简要介绍一下一二三产业发展资金使用情况？（预算资金多少？支出多少？）  
一二三产业使用情况支付宁夏旭源建设工程有限公司工程款，400000 元，付宁夏源鑫商贸有限公司反渗透净水机及吹风机门费 53695 元，付大武口游农天湖果蔬种植专业合作社杂粮款 59200 元，付苏金康安装费 105031 元，支付宁夏宁商文化传媒款项 30000 元，支付宁夏朔石规划建筑设计院有限公司设计费 20000 元，宁夏瑞拓建设工程有限公司工程进度款（星光村醋厂室外配套工程）500000 元，支付大武口区尚农天湖果蔬种植专业合作社杂粮款 35802 元。

2. 项目是否编制目标申报表？是否有发改局批复文件？  
食用醋厂附属配套工程没有申报表和批复文件，只有招中标通知书。

3. 请介绍一下本项目的经济效益？  
主体工程招标价 161 万，配套工程招标价 138 万。星光村食用醋厂自 2020 年 10 月份开始投产，2021 年 6 月 8 日食品生产许可证办理完结，截止 2021 年 8 月底，销售食用醋 12867 斤，销售金额 47681 余元，成本 2.5 元-2.6 元/斤，人工 14000/人/月，共计 3 人，截止目前项目尚处于前期打开销路阶段，尚未开始盈利。

4. 请介绍一下本项目的社会效益？  
食用醋厂在今后的发展中，广泛推销食用醋，让更多的人吃到纯手工、纯粮、食醋的无任何添加的绿色食用醋。项目的实施为壮大村集体经济做出了初步尝试。

5. 请简要介绍一下项目后续（维护、管理）长效管理机制？  
食用醋厂在今后的管理上会更加规范，严格按照国家食用产品的要求来管理本项目。

6. 按照《关于星光村发展壮大村集体经济项目的批复》（石大党组通〔2019〕57 号）要求，项目预算资金共计 120 万，用于食用醋厂加工配套项目，但是其中 40 万元用于支付宁夏旭源建设工程有限公司主体建设工程，杂粮款 95002 元，不符合批复适用范围，请简要说明原因？  
由于当时建设壮大村集体经济项目厂房资金短缺，经股民代表、理事会、监事会开会研究决定将一二三产业融合发展资金 400000 元支付给宁夏旭源建设工程有限公司工程款，95002 元支付杂粮款。

**星海镇果园村民俗园垂钓采摘项目  
相关管理人员访谈提纲**

1. 请简要介绍一下一二三产业发展资金使用情况？（预算资金多少？支出多少？）  
预算 50 万，支出 50 万。

2. 项目是否编制目标申报表？是否有发改局批复文件？  
无发改批复，无目标申报表

3. 请介绍一下本项目的经济效益？  
19 年 11 月 13 日，20 年 1 月 16 日，20 年 6 月 16 日，投入 170 万，2019 年 10 月投入运营，截止 2021 年 8 月底，收入到账尚未获得利润。

4. 请介绍一下本项目的社会效益？

5. 请简要介绍一下项目后续（维护、管理）长效管理机制？  
醋厂现在由星海村股份合作社管理。

## 附件五：意见签收单

### 2020 年大武口区一二三产业融合发展项目 绩效评价报告意见签收单

大武口区星海镇人民政府：

现送阅我公司关于 2020 年大武口区一二三产业融合发展项目绩效评价报告，请确认签字。


宁夏沪尚智评管理咨询有限公司

2021 年 9 月 15 日

回复意见栏：

- 1、P18【预算编制科学性】，5 个壮大村集体项目，其中星光村、枣香村、富民村 3 个壮大村集体项目进行了招投标，编制了招标控制价，具有项目预算和工程量清单，不应该全部扣分。
- 2、P21【资金使用合规性】仅抽查了星光村一个项目，星光村资金使用不合规，不能代表所有资金使用不合规，不具有说明性。
- 3、P61【指标体系评价表】资金使用合规性只有两项取分标准，且各占 1/3，不正确。

单位（项目）负责人：





2021 年 9 月 29 日

(公章)



备注：已按项目方意见进行调整。
